



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto, 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

SÃO JOÃO
UMA RUÍNA NA MARCHA
A PÓRICA DO POVO

Usuário: RENATO VALENÇA	Chave de Autenticação Digital 1510-9363-188	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/06/2024

Número: 1

Vencimento: 28/06/2024

Empenho: 817/2024

Aviso de liquidação: 289211

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000012024 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO	Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE
Un. orçam.: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO	Despesa: 327 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Função: 15 - Urbanismo	Elemento: 51 - Obras e Instalações
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	Detalhamento: 99 - outras obras e instalações
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	
Fonte recurso: 100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	

Importa este documento o valor de: cento e vinte e seis mil e cento e setenta e um reais e doze centavos

Favorecido

Credor: 2174 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	
Endereço: R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO	
Cidade: São Joaquim do Monte - PE	Fone: (81) 9829-0164
CNPJ: 35.978.627/0001-04	CEP: 55.670-000
Banco:	Agência:
Finalidade:	C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 058/2024.

Complemento

VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 058/2024.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 119 - 28/06/2024	R\$ 126.171,12		

Retenções Efetivadas

296 - IRRF - Pessoa Jurídica (Imposto de Renda Amp	R\$ 1.514,05	238 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pe	R\$ 5.551,53
61 - ISS - PMSJ	R\$ 2.523,43		

Valor deste documento:	R\$ 126.171,12
Total retido:	R\$ 9.589,01
Valor líquido	R\$ 116.582,11

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro



CONTRATO Nº 058/2024

PROCESSO: 014/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS
VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE

NOTAS FISCAIS CERTIDÕES

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro

São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000

E-mail: md.construcoes22@gmail.com

CNPJ: 35.978.627/0001-04

CONTRATO Nº 058/2024

PROCESSO: 014/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE

1ª MEDIÇÃO

EM ANEXO:

1. **NOTA FISCAL**
2. **BOLETIM DE MEDIÇÃO**
3. **MEMÓRIA DE CALCULO**
4. **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**
5. **DIÁRIO DE OBRA**
6. **A.R.T.**
7. **CNO**
8. **CREA DA EMPRESA**
9. **FOLHA DE PAGAMENTO**
10. **RELATÓRIO FGTS**
11. **FGTS E COMPROVANTE**
12. **RECIBO - DCTFWEB**
13. **CERTIDÕES FISCAIS**

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro

São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000

E-mail: md.construcoes22@gmail.com

CNPJ: 35.978.627/0001-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Av. Estácio Coimbra N° 45 - Centro, CEP 55670-000 - São Joaquim do Monte - PE TEL.: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43



Número da Nota:

00000119

Competência:

JUN/2024

Data e Hora Emissão:

28/06/2024 12:11:25

Código de Verificação:

SS4Q-ZPBKJ**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **SÃO JOÃO - PE** Local da Prestação: **SÃO JOÃO - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.978.627/0001-04** Inscrição Municipal: **1770**
Nome/Razão Social: **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA**
Endereço: **ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA ,CENTRO. 25 CASA / COMÉRCIO**
Município: **SÃO JOAQUIM DO MONTE** UF: **PE** CEP: **55670000**
E-mail: **mcmarcione@gmail.com** TEL: **8199338641**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.146.371/0001-30** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**
Endereço: **RUA AUGUSTO PEIXOTO, 31 CENTRO**
Município: **SÃO JOÃO** UF: **PE** CEP: **5543500**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra: **900194567177** Número ART: **PE20241149867**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO-PE, CONFORME CONTRATO N 058/2024, PROCESSO LICITATORIO N 014/2024 E CONCORRENCIA ELETRONICA N 001/2024, MAO DE OBRA 40% R\$ 50.468,45 E MATERIAL 60% R\$ 75.702,67. #QTD:1 - V.UND.:R\$126.171,12 - TOTAL.:R\$126.171,12

INSS 11% EM CIMA DA MAO DE OBRA 40%: R\$ 5.551,53
ISS 5% EM CIMA DA MAO DE OBRA 40%: R\$ 2.523,42
IRRF 1,2% DO VALOR TOTAL: R\$ 1.514,05
TOTAL DAS DEDUCOES: R\$ 9.589,00

DADOS BANCARIO
BRADESCO
AG: 6989
C/C: 62286
NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126.171,12

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4120400 -**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
112.796,98	0,00	126.171,12	5,00%	6.308,56
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	5.551,53	0,00	0,00	1.514,05
Outras Retenções(R\$)	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES5


- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saojoaquimdomonte/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

0194026645301

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saojoaquimdomonte/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1º TERMO ADITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO																					
LOCALIZAÇÃO: SÃO JOÃO - PE																					
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 014/2024																					
CC: N° 001/2024																					
PRAZO: 06 MESES																					
INÍCIO: 29/05/2024																					
EMPRESA: MID CONSTRUÇÕES E PROJETOS																					
CNPJ: 35.978.627/0001-04																					
FONTE DE RECURSOS:																					
ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	PREÇO UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO													
					PREVISTO	NOVOS	ACRESCIDOS	SUPRIMIDOS	REAL	PREVISTO	NOVOS	ACRESCIDOS	SUPRIMIDOS	REAL							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1	103688	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	m²	320,31	6,00					6,00	1.921,86									1.921,86	
1		BAIRRO DO PLANALTO (CAJUEIRO)																			
1.1		RUA JOSÉ CIGERO DE ALBUQUERQUE																			
1.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	84,07	45,62					45,62	3.835,27										3.835,27
1.2		PAVIMENTAÇÃO																			
1.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	322,70					322,70	187,16										187,16
1.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	91,54	1.703,19					1.703,19	155.910,01										155.910,01
1.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,49	608,20					608,20	33.749,01										33.749,01
1.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,40	608,20					608,20	25.179,48										25.179,48
1.3		SINALIZAÇÃO																			
1.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UN	95,03	8,00					8,00	760,24										760,24
1.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	8,00					8,00	1.080,88										1.080,88
1.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	8,00					8,00	1.941,76										1.941,76
1.3.4	COMP 28	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	16,00					16,00	4.873,76										4.873,76
2		RUA NELSON FRANCISCO																			
2.1		MOVIMENTO DE TERRA																			
2.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	84,07	5,33					5,33	448,09										448,09
2.2		PAVIMENTAÇÃO																			
2.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	35,50					35,50	20,59										20,59


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 22.127 D


2.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	91,54	227,20	227,20	20.797,88	-	-	20.797,88
2.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	55,49	71,00	71,00	3.939,79	-	-	3.939,79
2.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	41,40	71,00	71,00	2.939,40	-	-	2.939,40
2.3		SINALIZAÇÃO								
2.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	1,00	1,00	95,03	-	-	95,03
2.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	1,00	1,00	135,11	-	-	135,11
2.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	1,00	1,00	242,72	-	-	242,72
2.3.4	COMP 28	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	2,00	2,00	609,22	-	-	609,22
3		2ª TRAVESSA JOÃO FELIX DOS SANTOS								
3.1		MOVIMENTO DE TERRA								
3.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	84,07	18,18	18,18	1.528,39	-	-	1.528,39
3.2		PAVIMENTAÇÃO								
3.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	0,58	121,20	121,20	70,29	-	-	70,29
3.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	91,54	618,12	618,12	56.582,70	-	-	56.582,70
3.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	55,49	231,80	231,80	12.862,58	-	-	12.862,58
3.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	41,40	231,80	231,80	9.596,52	-	-	9.596,52
3.3		SINALIZAÇÃO								
3.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	5,00	5,00	475,15	-	-	475,15
3.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	5,00	5,00	675,55	-	-	675,55
3.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	5,00	5,00	1.213,60	-	-	1.213,60
3.3.4	COMP 28	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	10,00	10,00	3.046,10	-	-	3.046,10
4		RUA AVYRTON SENNA								
4.1		MOVIMENTO DE TERRA								
4.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	84,07	20,96	20,96	1.762,10	-	-	1.762,10
4.2		PAVIMENTAÇÃO								
4.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	0,58	139,70	139,70	81,02	-	-	81,02
4.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	91,54	656,59	656,59	60.104,24	-	-	60.104,24


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 22.127 D

4.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	55,49	279,40	279,40	15.503,90	-	-	15.503,90
4.2.4	94281	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	41,40	279,40	279,40	11.567,16	-	-	11.567,16
4.3	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	5,00	5,00	475,15	-	-	475,15
4.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	5,00	5,00	675,55	-	-	675,55
4.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	5,00	5,00	1.213,60	-	-	1.213,60
4.3.4	COMP 28	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	10,00	10,00	3.046,10	-	-	3.046,10
5		RUA MANOEL PEREIRA MATOS								
5.1		MOVIMENTO DE TERRA								
5.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m²	84,07	26,27	26,27	2.208,51	-	-	2.208,51
5.2		PAVIMENTAÇÃO								
5.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,58	184,10	184,10	106,77	-	-	106,77
5.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	91,54	957,99	957,99	87.694,40	-	-	87.694,40
5.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	55,49	350,30	350,30	19.438,14	-	-	19.438,14
5.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	41,40	350,30	350,30	14.502,42	-	-	14.502,42
5.3		SINALIZAÇÃO								
5.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	3,00	3,00	285,09	-	-	285,09
5.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	2,00	2,00	270,22	-	-	270,22
5.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	2,00	2,00	485,44	-	-	485,44
5.3.4	COMP 28	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	4,00	4,00	1.218,44	-	-	1.218,44
6		RUA PROJETA								
6.1		MOVIMENTO DE TERRA								
6.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m²	84,07	16,58	16,58	1.393,88	-	-	1.393,88
6.2		PAVIMENTAÇÃO								
6.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,58	110,56	110,56	64,12	-	-	64,12
6.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	91,54	608,08	608,08	55.663,64	-	-	55.663,64


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. 22.127 D

6.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	M	55,49	221,12				221,12	12.269,94	-	-	12.269,94
6.2.4	94281	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 08/2016	M	41,40	221,12				221,12	9.154,36	-	-	9.154,36
6.3	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA. *45 CM X 20* CM	UN	95,03	2,00				2,00	190,06	-	-	190,06
6.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	1,00				1,00	135,11	-	-	135,11
6.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	1,00				1,00	242,72	-	-	242,72
6.3.4	COMP 28	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	2,00				2,00	609,22	-	-	609,22
7	RUA JOÃO FELIX DOS SANTOS												
7.1	MOVIMENTO DE TERRA												
7.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	84,07	72,92				72,92	6.130,38	-	-	6.130,38
7.2	PAVIMENTAÇÃO												
7.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	248,96				248,96	144,39	-	-	144,39
7.2.2	101169	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	91,54	1.419,07				1.419,07	129.901,66	-	-	129.901,66
7.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	M	55,49	486,12				486,12	26.974,79	-	-	26.974,79
7.2.4	94281	MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 08/2016	M	41,40	486,12				486,12	20.125,36	-	-	20.125,36
7.3	SINALIZAÇÃO												
7.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA. *45 CM X 20* CM	UN	95,03	5,00				5,00	475,15	-	-	475,15
7.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	5,00				5,00	675,55	-	-	675,55
7.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO 1 + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	5,00				5,00	1.213,60	-	-	1.213,60
7.3.4	COMP 28	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	10,00				10,00	3.046,10	-	-	3.046,10
1	RUA HIGINO DA COSTA												
1.1	MOVIMENTO DE TERRA												
1.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	84,07	27,80			0,22	28,02	2.337,14	-	18,49	2.355,64
1.2	PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	185,30			0,73	186,03	107,47	-	0,42	107,89
1.2.2	101169	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	91,54	759,73			143,76	903,49	69.545,68	-	13.159,79	82.705,47


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D

1.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 08/2016.	M	55,49	370,60	2,98	373,58	20.564,59	165,36	20.729,95
1.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 08/2016.	M	41,40	370,60	20,37	390,97	15.342,84	843,31	16.186,15
1.3		SINALIZAÇÃO								
1.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	2,00		2,00	190,06	-	190,06
1.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	2,00		2,00	270,22	-	270,22
1.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	2,00		2,00	485,44	-	485,44
1.3.4	COMP 28	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	4,00		4,00	1.218,44	-	1.218,44
TOTAL GERAL										
									1º TERMO ADITIVO	14.187,37
									14.187,37	

O VALOR DO 1º TERMO ADITIVO, EM COMUM ACORDO DAS PARTES, É DE SUPRESSÃO DE R\$ 14.187,37 (QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

1º T.A.	VALOR DO CONTRATO	943.828,30
	VALOR NOVOS	0,00
	VALOR ACRESCIDOS	14.187,37
	VALOR SUPRIMIDO	0,00
	PERCENTUAL 1º T.A.	1,50%

W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 Sandoiro W. de Oliveira Gomes
 CREA - P. 22.127 D

MANUTENÇÃO DO DESCONTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: SÃO JOÃO - PE


ITEM	Descrição	Quant. Inicial	Situação Original			Quant. Final	Situação Após Aditivo		
			Planilha Contratual		Orçamento de Referência Total (R\$)		Planilha Contratual		Planilha de Referência Total (R\$)
			P. Unit. (c/BDD)	Total (R\$)			Total (R\$)	Total (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	320,31	1.921,86	369,56	2.217,36	6,00	1.921,86	2.217,36
1	BAIRRO DO PLANALTO (CAJUEIRO)								
1.1	RUA JOSÉ CÍCERO DE ALBUQUERQUE								
1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA								
1.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	45,62	84,07	3.835,27	95,57	4.359,90	45,62	3.835,27	4.359,90
1.2	PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	322,70	0,58	187,16	0,60	193,62	322,70	187,16	193,62
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	1.703,19	91,54	155.910,01	103,93	177.012,53	1.703,19	155.910,01	177.012,53
1.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	608,20	55,49	33.749,01	63,75	38.772,75	608,20	33.749,01	38.772,75
1.2.4	EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	608,20	41,40	25.179,48	46,99	28.579,31	608,20	25.179,48	28.579,31
1.3	SINALIZAÇÃO								
1.3.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	8,00	95,03	760,24	110,84	886,72	8,00	760,24	886,72
1.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	8,00	135,11	1.080,88	152,95	1.223,60	8,00	1.080,88	1.223,60
1.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	8,00	242,72	1.941,76	275,22	2.201,76	8,00	1.941,76	2.201,76


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D


1.3.4	COMP 28	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	16,00	304,61	4.873,76	329,47	5.271,52	16,00	4.873,76	5.271,52
2		RUA NELSON FRANCISCO									
2.1		MOVIMENTO DE TERRA									
2.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	5,33	84,07	448,09	95,57	509,38	5,33	448,09	509,38
2.2		PAVIMENTAÇÃO									
2.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	35,50	0,58	20,59	0,60	21,30	35,50	20,59	21,30
2.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	227,20	91,54	20.797,88	103,93	23.612,89	227,20	20.797,88	23.612,89
2.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	71,00	55,49	3.939,79	63,75	4.526,25	71,00	3.939,79	4.526,25
2.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	71,00	41,40	2.939,40	46,99	3.336,29	71,00	2.939,40	3.336,29
2.3		SINALIZAÇÃO									
2.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	95,03	95,03	110,84	110,84	1,00	95,03	110,84
2.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	135,11	135,11	152,95	152,95	1,00	135,11	152,95
2.3.3	COMP 27	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	304,61	609,22	329,47	658,94	2,00	609,22	658,94
2.3.4	COMP 28	2ª TRAVESSA JOÃO FELIX DOS SANTOS									
3		MOVIMENTO DE TERRA									
3.1		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016									
3.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	18,18	84,07	1.528,39	95,57	1.737,46	18,18	1.528,39	1.737,46
3.2		PAVIMENTAÇÃO									
3.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	121,20	0,58	70,29	0,60	72,72	121,20	70,29	72,72


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PE.22.127 D

3.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	618,12	91,54	56.582,70	103,93	64.241,21	618,12	56.582,70	64.241,21
3.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	231,80	55,49	12.862,58	63,75	14.777,25	231,80	12.862,58	14.777,25
3.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	231,80	41,40	9.596,52	46,99	10.892,28	231,80	9.596,52	10.892,28
3.3		SINALIZAÇÃO									
3.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	5,00	95,03	475,15	110,84	554,20	5,00	475,15	554,20
3.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	5,00	135,11	675,55	152,95	764,75	5,00	675,55	764,75
3.3.3	COMP 27	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	10,00	304,61	3.046,10	329,47	3.294,70	10,00	3.046,10	3.294,70
4		RUA AYRTON SENNA									
4.1		MOVIMENTO DE TERRA									
4.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	20,96	84,07	1.762,10	95,57	2.003,14	20,96	1.762,10	2.003,14
4.2		PAVIMENTAÇÃO									
4.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	139,70	0,58	81,02	0,60	83,82	139,70	81,02	83,82
4.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	656,59	91,54	60.104,24	103,93	68.239,39	656,59	60.104,24	68.239,39
4.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	279,40	55,49	15.503,90	63,75	17.811,75	279,40	15.503,90	17.811,75
4.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	279,40	41,40	11.567,16	46,99	13.129,00	279,40	11.567,16	13.129,00


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D

5.3.4	COMP 28	SUPOORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	4,00	304,61	1.218,44	329,47	1.317,88	4,00	1.218,44	1.317,88	1.317,88
6		RUA PROJETA DA										
6.1		MOVIMENTO DE TERRA										
6.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA_AF_05/2016	m³	16,58	84,07	1.393,88	95,57	1.584,55	16,58	1.393,88	1.584,55	1.584,55
6.2		PAVIMENTAÇÃO										
6.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO_AF_10/2018	M	110,56	0,58	64,12	0,60	66,33	110,56	64,12	66,33	66,33
6.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)_AF_05/2020	m²	608,08	91,54	55.663,64	103,93	63.197,75	608,08	55.663,64	63.197,75	63.197,75
6.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)_AF_06/2016	M	221,12	55,49	12.269,94	63,75	14.096,40	221,12	12.269,94	14.096,40	14.096,40
6.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA_AF_06/2016	M	221,12	41,40	9.154,36	46,99	10.390,42	221,12	9.154,36	10.390,42	10.390,42
6.3		SINALIZAÇÃO										
6.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	95,03	190,06	110,84	221,68	2,00	190,06	221,68	221,68
6.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	135,11	135,11	152,95	152,95	1,00	135,11	152,95	152,95
6.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	242,72	242,72	275,22	275,22	1,00	242,72	275,22	275,22
6.3.4	COMP 28	SUPOORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	304,61	609,22	329,47	658,94	2,00	609,22	658,94	658,94
7		RUA JOÃO FELIX DOS SANTOS										
7.1		MOVIMENTO DE TERRA										
7.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA_AF_05/2016	m³	72,92	84,07	6.130,38	95,57	6.968,96	72,92	6.130,38	6.968,96	6.968,96
7.2		PAVIMENTAÇÃO										
7.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO_AF_10/2018	M	248,96	0,58	144,39	0,60	149,37	248,96	144,39	149,37	149,37


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D

7.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	1.419,07	91,54	129.901,66	103,93	147.483,94	1.419,07	129.901,66	147.483,94
7.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	486,12	55,49	26.974,79	63,75	30.990,15	486,12	26.974,79	30.990,15
7.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	486,12	41,40	20.125,36	46,99	22.842,77	486,12	20.125,36	22.842,77
7.3		SINALIZAÇÃO									
7.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	5,00	95,03	475,15	110,84	554,20	5,00	475,15	554,20
7.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	un	5,00	135,11	675,55	152,95	764,75	5,00	675,55	764,75
7.3.3	COMP 27	EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	10,00	304,61	3.046,10	329,47	3.294,70	10,00	3.046,10	3.294,70
7.3.4	COMP 28	CENTRO - RUA DO CORTE									
1		RUA HIGINO DA COSTA									
1.1		MOVIMENTO DE TERRA									
1.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	27,80	84,07	2.337,14	95,57	2.656,84	28,02	2.355,64	2.677,87
1.2		PAVIMENTAÇÃO									
1.2.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	185,30	0,58	107,47	0,60	111,18	186,03	107,89	111,61
1.2.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	m²	759,73	91,54	69.545,68	103,93	78.958,73	903,49	82.705,47	93.899,71
1.2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	370,60	55,49	20.564,59	63,75	23.625,75	373,58	20.729,95	23.815,72

Sandro W. de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CRFA - PE. 22.127 D

1.2.4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016.	M	370,60	41,40	15.342,84	46,99	17.414,49	390,97	16.186,15	18.371,68
1.3		SINALIZAÇÃO									
1.3.1	COMP 25	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	95,03	190,06	110,84	221,68	2,00	190,06	221,68
1.3.2	COMP 26	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	135,11	270,22	152,95	305,90	2,00	270,22	305,90
1.3.3	COMP 27	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	2,00	242,72	485,44	275,22	550,44	2,00	485,44	550,44
1.3.4	COMP 28	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	4,00	304,61	1.218,44	329,47	1.317,88	4,00	1.218,44	1.317,88
TOTAIS						R\$ 943.828,30		R\$ 1.072.606,65		R\$ 958.015,67	R\$ 1.088.716,25

Método de Desconto

Orçamento paradigma final:	R\$ 1.088.716,25
Desconto Original:	R\$ 130.712,49
	12,01%
	0,00% AUMENTOU O DESCONTO
Valor final paradigma do contrato com desconto	R\$ 958.003,76
Valor do contrato após aditivos	R\$ 958.015,67
Valor final paradigma do contrato com desconto	R\$ 958.003,76

NÃO HÁ SOBREPREGO, UMA VEZ QUE O DESCONTO NÃO SOFREU DIMINUIÇÃO (DECRETO Nº 7983/2013)

A manutenção do desconto após a celebração de aditivos contratuais não é automática, exigindo negociação específica com a contratada nesse sentido. Na prática, surgem diversas dúvidas sobre a forma correta de se proceder, pois, no caso de aditamentos contratuais, o percentual de desconto inevitavelmente será alterado e a sua manutenção obrigaria a alteração dos preços unitários pactuados. Todavia, a cada nova medição haveria alteração dos quantitativos pagos e novos preços unitários precisariam ser calculados para manter o desconto original do contrato.

Diante do exposto, a melhor forma de operacionalizar o mecanismo seria efetuar o pagamento dos serviços cujo quantitativo foi alterado pelos preços originais, porém, fazendo-se uso de uma parcela compensatória negativa a ser abatida do total de cada medição para manter o desconto. Tal entendimento foi adotado no Acórdão TCU nº 1.200/2010 – Plenário


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

LOCALIZAÇÃO: SÃO JOÃO - PE

BASE DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO /

BDI

19,21%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º TERMO ADITIVO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	comp.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m ²	2,00	3,00				6,00
		PLACA DE OBRA							-
									6,00
BAIRRO DO PLANALTO (CAJUEIRO)									
1		RUA JOSÉ CÍCERO DE ALBUQUERQUE							
2		RUA NELSON FRANCISCO							
3		2ª TRAVESSA JOÃO FELIX DOS SANTOS							
4		RUA AYRTON SENNA							
5		RUA MANOEL PEREIRA MATOS							
6		RUA PROJETADA							
7		RUA JOÃO FELIX DOS SANTOS							
CENTRO (CORTE)									
1		RUA HIGINO DA COSTA							
1.1		MOVIMENTOS DE TERRA							
1.1.1	SINAPI 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M ²						
		LADO A		0,50	0,15				15,19
		LADO B		0,50	0,15				12,83
									-
1.2		PAVIMENTAÇÃO							28,02


Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D

1.2.1	SINAPI 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M ²	comp.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
		TRECHO C		4,01						4,01
		TRECHO E		14,30						14,30
		TRECHO F		19,15						19,15
		TRECHO G		20,00						20,00
		TRECHO H		20,00						20,00
		TRECHO I		20,00						20,00
		TRECHO J		20,00						20,00
		TRECHO K		20,00						20,00
		TRECHO L		20,00						20,00
		TRECHO M		20,00						20,00
		TRECHO N		8,57						8,57
										-
										186,03
1.2.2	SINAPI 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M ²	comp.	largura	altura	quant.	coef.	desc.	total
		TRECHO A (3,63*5,40)/2					9,80			9,80
		TRECHO B (3,63*2,62)/2					4,76			4,76
		TRECHO C		5,74	4,01					23,02
		TRECHO D (7,44*12)/2					44,64			44,64
		TRECHO E		14,30	5,66					80,94
		TRECHO F		19,15	4,58					87,71
		TRECHO G		20,00	3,73					74,60
		TRECHO H		20,00	4,01					80,20
		TRECHO I		20,00	4,12					82,40
		TRECHO J		20,00	4,12					82,40
		TRECHO K		20,00	4,12					82,40
		TRECHO L		20,00	4,11					82,20
		TRECHO M		20,00	4,48					89,60
		TRECHO N		8,57	8,91					76,36
		TRECHO O (2,20*1,2)/2					1,32			1,32
		TRECHO P (2,10*1,1)/2					1,15			1,15

Sandra W. de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CREA - PE.22.127 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BOLETIM N.º

001/2024

DATA: 21/06/2024

PERÍODO: 29/05/2024 à 21/06/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: PARQUE ALVORADA - SÃO JOÃO - PE

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2024

PRAZO: 04 MESES

INÍCIO: 29/05/2024

N.º DA OPERAÇÃO:

FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS:

FONTE TOTAL DE RECURSOS:

CNPJ DA UNIDADE

CONTRATO : 058/2024

RS

1.º TERMO ADITIVO

RS

VL. CONSOLIDADO CONTRATO

RS

SALDO ANTERIOR

RS

ESTA MEDIÇÃO

RS

SALDO ATUAL

RS

REF. SINAPUPE NÃO DESONERADO FEV/2024

126.171,12

831.844,55

126.171,12

ESTA MEDIÇÃO

126.171,12

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
- 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
- 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
- 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF.06/2016
- 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima

* A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

Item	Tabela	Códigos	Discriminação	Unid.	Custo	Quantidade		Financeiro		%	
						Previsão	Boletim 01	Previsão	Medido no Período BM 01		Acumulado incluindo o Período
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF.04/2022.DS	m²	320,31	6,00	6,00	1.921,86	1.921,86	1.921,86	100,00%
1			BAIRRO DO PLANALTO (CAJUEIRO)								
1.1			RUA JOSÉ CICERO DE ALBUQUERQUE					227.517,57	-	-	
1.1.1	94319	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA					3.835,27	-	-	
1.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF.05/2016	m³	84,07	45,62	-	3.835,27	-	-	0,00%
1.2			PAVIMENTAÇÃO					215.025,66	-	-	
1.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	0,58	322,70	-	187,16	-	-	0,00%
1.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF.06/2016	m²	91,54	1.703,19	-	155.910,01	-	-	0,00%
1.2.3	94273	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF.06/2016	M	55,49	608,20	-	33.749,01	-	-	0,00%
1.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF.06/2016	M	41,40	608,20	-	25.179,48	-	-	0,00%
1.3			SINALIZAÇÃO					8.656,64	-	-	

Assinado de forma digital por
M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
L35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:43:01
-03'00"

Assinado de forma digital por DAVI WILSON
LUCENA DO
O-01327337495
Dados: 2024.06.25 08:59:08 -03'00"

Luis Felipe ~~Contra~~ Oliveira Torres
Engenharia Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

1.3.1	COMP 25	PRÓPRIO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	95,03	8,00	-	760,24	-	-	0,00%
1.3.2	COMP 26	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	8,00	-	1.080,88	-	-	0,00%
1.3.3	COMP 27	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	8,00	-	1.941,76	-	-	0,00%
1.3.4	COMP 28	PRÓPRIO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	16,00	-	4.873,76	-	-	0,00%
2			RUA NELSON FRANCISCO					29.227,83			
2.1			MOVIMENTO DE TERRA					448,09			
2.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	84,07	5,33	-	448,09	-	-	0,00%
2.2			PAVIMENTAÇÃO					27.687,66			
2.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,58	35,50	-	20,59	-	-	0,00%
2.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	91,54	227,20	-	20.797,88	-	-	0,00%
2.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	55,49	71,00	-	3.939,79	-	-	0,00%
2.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	41,40	71,00	-	2.939,40	-	-	0,00%
2.3			SINALIZAÇÃO					1.082,08			
2.3.1	COMP 25	PRÓPRIO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	95,03	1,00	-	95,03	-	-	0,00%
2.3.2	COMP 26	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	1,00	-	135,11	-	-	0,00%
2.3.3	COMP 27	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	1,00	-	242,72	-	-	0,00%
2.3.4	COMP 28	PRÓPRIO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	2,00	-	609,22	-	-	0,00%
3			2ª TRAVESSA JOÃO FELIX DOS SANTOS					86.050,88			
3.1			MOVIMENTO DE TERRA					1.528,39			
3.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m³	84,07	18,18	-	1.528,39	-	-	0,00%
3.2			PAVIMENTAÇÃO					79.112,09			
3.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	0,58	121,20	-	70,29	-	-	0,00%
3.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	91,54	618,12	-	56.582,70	-	-	0,00%
3.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	55,49	231,80	-	12.862,58	-	-	0,00%
3.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	41,40	231,80	-	9.596,52	-	-	0,00%
3.3			SINALIZAÇÃO					5.410,40			
3.3.1	COMP 25	PRÓPRIO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	95,03	5,00	-	475,15	-	-	0,00%
3.3.2	COMP 26	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	5,00	-	675,55	-	-	0,00%

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

Assinado de forma digital
por DAVI WILSON LUCENA
DO:001327337495
Dados: 2024.06.25 08:58:54
-03100

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

M. M. DA SILVA
M. M. DA SILVA OLIVEIRA
OLIVEIRA CONSTRUCOAO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
DE EDIFICIOS
L35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:43:16
-03100

3.3.3	COMP 27	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	5,00	-	1.213,60	-	-	0,00%
3.3.4	COMP 28	PRÓPRIO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	10,00	-	3.046,10	-	-	0,00%
4			RUA AYRTON SENNA					94.428,82			
4.1			MOVIMENTO DE TERRA					1.762,10			
4.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	84,07	20,96	-	1.762,10	-	-	0,00%
4.2			PAVIMENTAÇÃO					87.256,32			
4.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	139,70	-	81,02	-	-	0,00%
4.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	91,54	656,59	-	60.104,24	-	-	0,00%
4.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,49	279,40	-	15.503,90	-	-	0,00%
4.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,40	279,40	-	11.567,16	-	-	0,00%
4.3			SINALIZAÇÃO					5.410,40			
4.3.1	COMP 25	PRÓPRIO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	5,00	-	475,15	-	-	0,00%
4.3.2	COMP 26	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	5,00	-	675,55	-	-	0,00%
4.3.3	COMP 27	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	5,00	-	1.213,60	-	-	0,00%
4.3.4	COMP 28	PRÓPRIO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	10,00	-	3.046,10	-	-	0,00%
5			RUA MANOEL PEREIRA MATOS					126.209,43			
5.1			MOVIMENTO DE TERRA					2.208,51			
5.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	84,07	26,27	-	2.208,51	-	-	0,00%
5.2			PAVIMENTAÇÃO					121.741,73			
5.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	184,10	-	106,77	-	-	0,00%
5.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	91,54	957,99	-	87.694,40	-	-	0,00%
5.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,49	350,30	-	19.438,14	-	-	0,00%
5.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,40	350,30	-	14.502,42	-	-	0,00%
5.3			SINALIZAÇÃO					2.259,19			
5.3.1	COMP 25	PRÓPRIO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	3,00	-	285,09	-	-	0,00%
5.3.2	COMP 26	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	2,00	-	270,22	-	-	0,00%
5.3.3	COMP 27	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	2,00	-	485,44	-	-	0,00%
5.3.4	COMP 28	PRÓPRIO	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	4,00	-	1.218,44	-	-	0,00%

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O01327337495 08-58-39 -03/00

DAVI WILSON LUCENA DO O01327337495

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS L:53978627000104

1.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	84,07	28,02	28,02	2.355,64	2.355,64	2.355,64	100,00%
1.2			PAVIMENTAÇÃO					119.729,46	119.729,46	119.729,46	100,00%
1.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	0,58	186,03	186,03	107,89	107,89	107,89	100,00%
1.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	91,54	903,49	903,49	82.705,47	82.705,47	82.705,47	100,00%
1.2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,49	373,58	373,58	20.729,95	20.729,95	20.729,95	100,00%
1.2.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	41,40	390,97	390,97	16.186,15	16.186,15	16.186,15	100,00%
1.3			SINALIZAÇÃO					2.164,16	2.164,16	2.164,16	100,00%
1.3.1	COMP 25	PRÓPRIO	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	95,03	2,00	2,00	190,06	190,06	190,06	100,00%
1.3.2	COMP 26	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	135,11	2,00	2,00	270,22	270,22	270,22	100,00%
1.3.3	COMP 27	PRÓPRIO	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	242,72	2,00	2,00	485,44	485,44	485,44	100,00%
1.3.4	COMP 28	PRÓPRIO	SUORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	304,61	4,00	4,00	1.218,44	1.218,44	1.218,44	100,00%
TOTAL GERAL								958.015,68	126.171,12	126.171,12	13,17%

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

RESUMO	
BM 1	126.171,12
BM 2	
BM 3	
TOTAL	126.171,12

SALDO ANTERIOR R\$	R\$ 958.015,68
ESTA MEDIÇÃO	R\$ 126.171,12
SALDO REMANESCENTE	R\$ 831.844,56

OBSERVAÇÕES:

O pagamento desta medição ficará condicionado à apresentação pela contratada da:

- 1- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA);
 - 2- Do Registro da obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO) instituído pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018;
 - 3- Da folha de pagamento relativa a mão de obra alocada aos serviços contratados, juntamente com as guias de FGTS e GFIP;
 - 4- Por fim, já adiante que o pagamento de cada medição só deverá ser realizado pelo setor financeiro, mediante apresentação de todos os comprovantes de pagamento das contribuições previdenciárias vinculadas ao
 - 5- Que cada Bm seja encaminhado, antes da liquidação, para o gestor de contrato, caso não tenha sido nomeado, que seja encaminhado para o ordenador de despesas, para que seja verificado e atestado tudo acima
- * A omissão da prestação do requerido ficará de responsabilidade de cada setor competente, podendo responder administrativamente aquele que não cumprir o solicitado.

ART EXECUÇÃO	ok
DIÁRIO DE OBRAS	ok
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	ok

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCÃO DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:43:56
-03'00'

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:0132733749
5

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA
WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:58:07 -03'00'

Luis Felipe Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

LOCALIZAÇÃO: SÃO JOÃO - PE

BDI

18,21%

BASE DE REFERÊNCIA: SINAPI NÃO DESONERADO /

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 1

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	comp.	largura	altura	quant.	co ef	desc.	total
		PLACA DE OBRA			2,00	3,00				6,00
										-
										6,00
BAIRRO DO PLANALTO (CAJUEIRO)										
1		RUA JOSÉ CÍCERO DE ALBUQUERQUE								
2		RUA NELSON FRANCISCO								
3		2ª TRAVESSA JOÃO FELIX DOS SANTOS								
4		RUA AYRTON SENNA								
5		RUA MANOEL PEREIRA MATOS								
6		RUA PROJETADA								
7		RUA JOÃO FELIX DOS SANTOS								
CENTRO (CORTE)										
1		RUA HIGINO DA COSTA								
1.1		MOVIMENTOS DE TERRA								
1.1.1	SINAPI 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M²	comp.	largura	altura	quant.	co ef	desc.	total
		LADO A			202,52	0,50	0,15			15,19
		LADO B			171,06	0,50	0,15			12,83
										-
										28,02
1.2		PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	SINAPI 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M²	comp.	largura	altura	quant.	co ef	desc.	total
		TRECHO C			4,01					4,01
		TRECHO E			14,30					14,30
		TRECHO F			19,15					19,15
		TRECHO G			20,00					20,00
		TRECHO H			20,00					20,00
		TRECHO I			20,00					20,00
		TRECHO J			20,00					20,00
		TRECHO K			20,00					20,00
		TRECHO L			20,00					20,00
		TRECHO M			20,00					20,00
		TRECHO N			8,57					8,57
										-
										186,03
1.2.2	SINAPI 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M²	comp.	largura	altura	quant.	co ef	desc.	total
		TRECHO A (3,63*5,40)/2					9,80			9,80
		TRECHO B (3,63*2,62)/2					4,76			4,76
		TRECHO C			5,74	4,01				23,02
		TRECHO D (7,44*12)/2					44,64			44,64
		TRECHO E			14,30	5,86				80,94
		TRECHO F			19,15	4,58				87,71
		TRECHO G			20,00	3,73				74,60
		TRECHO H			20,00	4,01				80,20
		TRECHO I			20,00	4,12				82,40
		TRECHO J			20,00	4,12				82,40
		TRECHO K			20,00	4,12				82,40
		TRECHO L			20,00	4,11				82,20
		TRECHO M			20,00	4,48				89,60
		TRECHO N			8,57	8,91				76,36
		TRECHO O (2,20*1,2)/2					1,32			1,32
		TRECHO P (2,10*1,1)/2					1,15			1,15
										-
										903,49
1.2.3	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	comp.	largura	altura	quant.	co ef	desc.	total
		LADO A			202,52					202,52

		LADO B			171,06					171,06
										373,58
1.2.4	SINAPI 94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	comp.	largura	altura	quant	co ef	desc.	total
							373,58			373,58
							14,30			14,30
							3,09			3,09
										390,97
1.3		SINALIZAÇÃO								
1.3.1		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	comp.	largura	altura	quant	co ef	desc.	total
							2,00			2,00
										-
										2,00
1.3.2		Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	comp.	largura	altura	quant	co ef	desc.	total
							2,00			2,00
										-
										2,00
1.3.3		Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	comp.	largura	altura	quant	co ef	desc.	total
							2,00			2,00
										-
										2,00
1.3.4		Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	comp.	largura	altura	quant	co ef	desc.	total
							4,00			4,00
										-
										4,00

M. M. DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104
L:35978627000104

Assinado de forma digital
por M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:44:34
-03'00'

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital
por DAVI WILSON LUCENA
DO O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:59:38
-03'00'

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA/PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
LOCAL: SÃO JOÃO - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por
M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:44:51
-03'00'

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma
digital por DAVI
WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25
08:57:36 -03'00'

Luis Felipe  Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
LOCAL: SÃO JOÃO - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital
por M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:45:08
-03'00'

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:013273374
95

Assinado de forma
digital por DAVI
WILSON LUCENA
DO O:01327337495
Dados: 2024.06.25
08:57:20 -03'00'

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: SÃO JOÃO - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
LOCAL: SÃO JOÃO - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por
M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:45:39
-03'00'

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma
digital por DAVI
WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25
08:56:50 -03'00'

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO - PE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
LOCAL: SÃO JOÃO - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por
M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:45:53
-03'00"

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital
por DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25
08:56:34 -03'00"

Luis Felipe Cordeira Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FISCALIZAÇÃO

RUA: HIGINO COSTA



Luis Felipe Carneiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

PREFEITURA DE SÃO JOÃO


Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA**

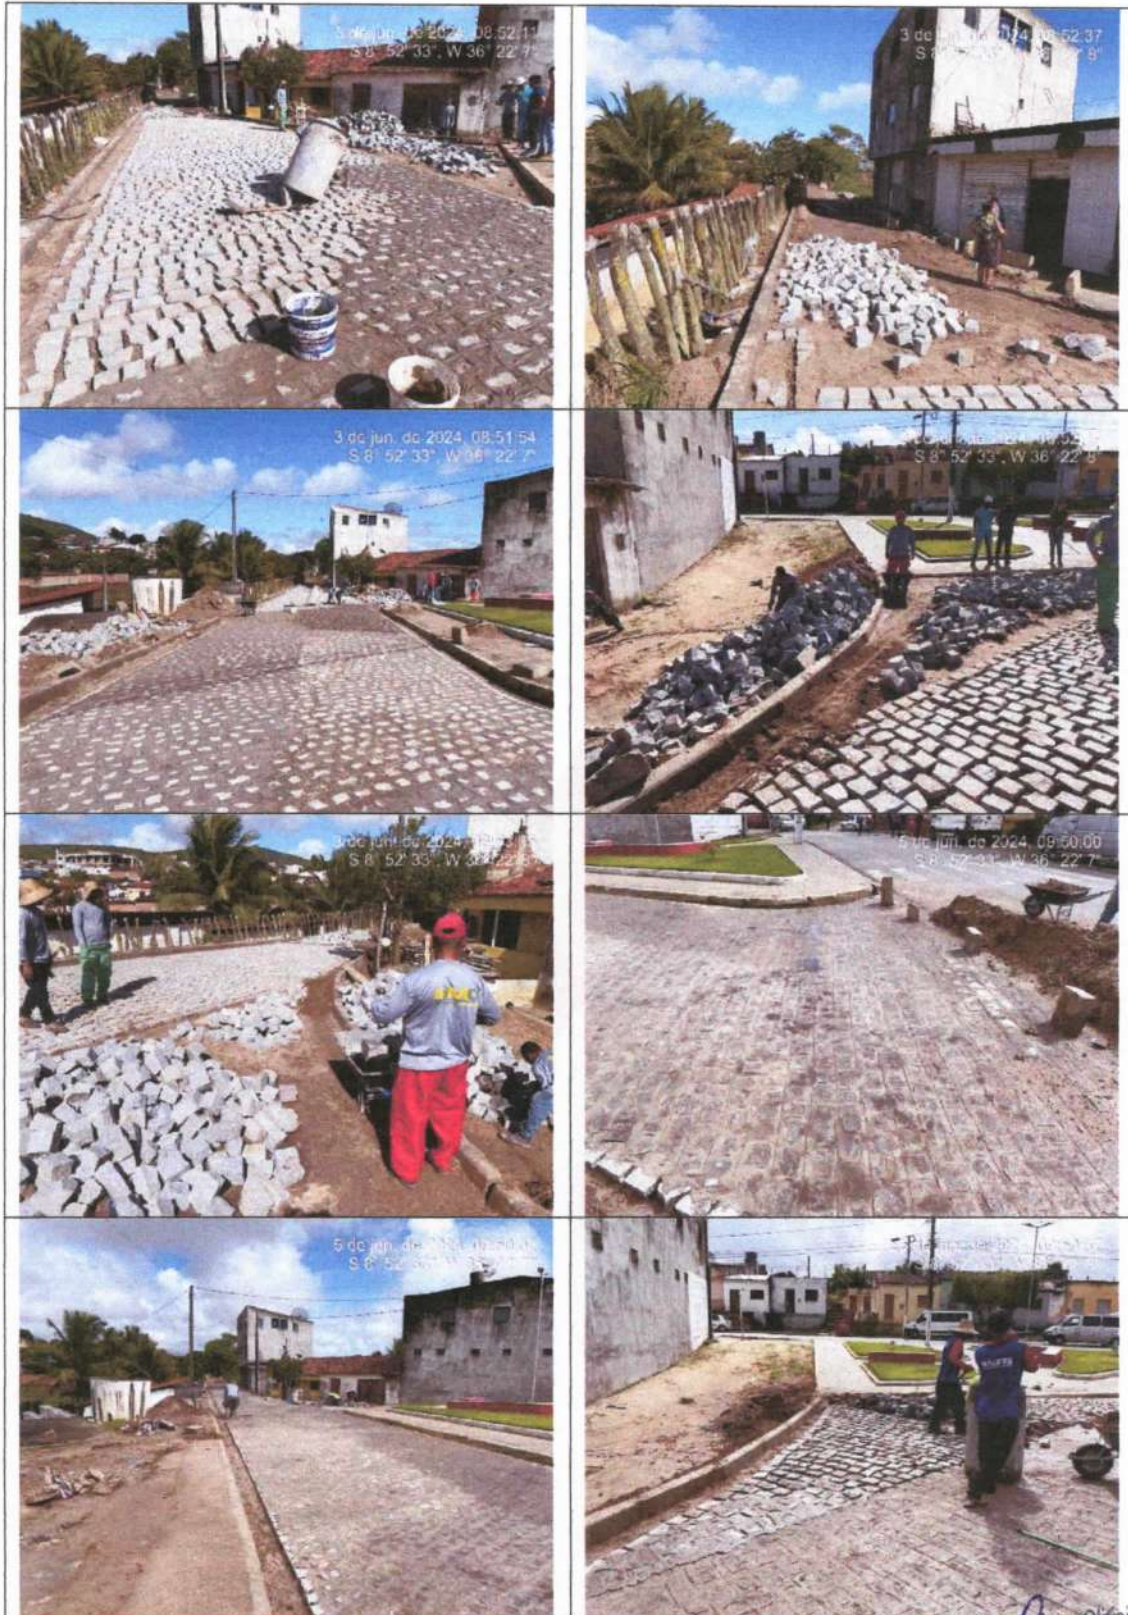

Luis Felipe Carneiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65
CEP: 55.435-000



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA**



Luis Felipe  Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

PREFEITURA DE SÃO JOÃO


Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

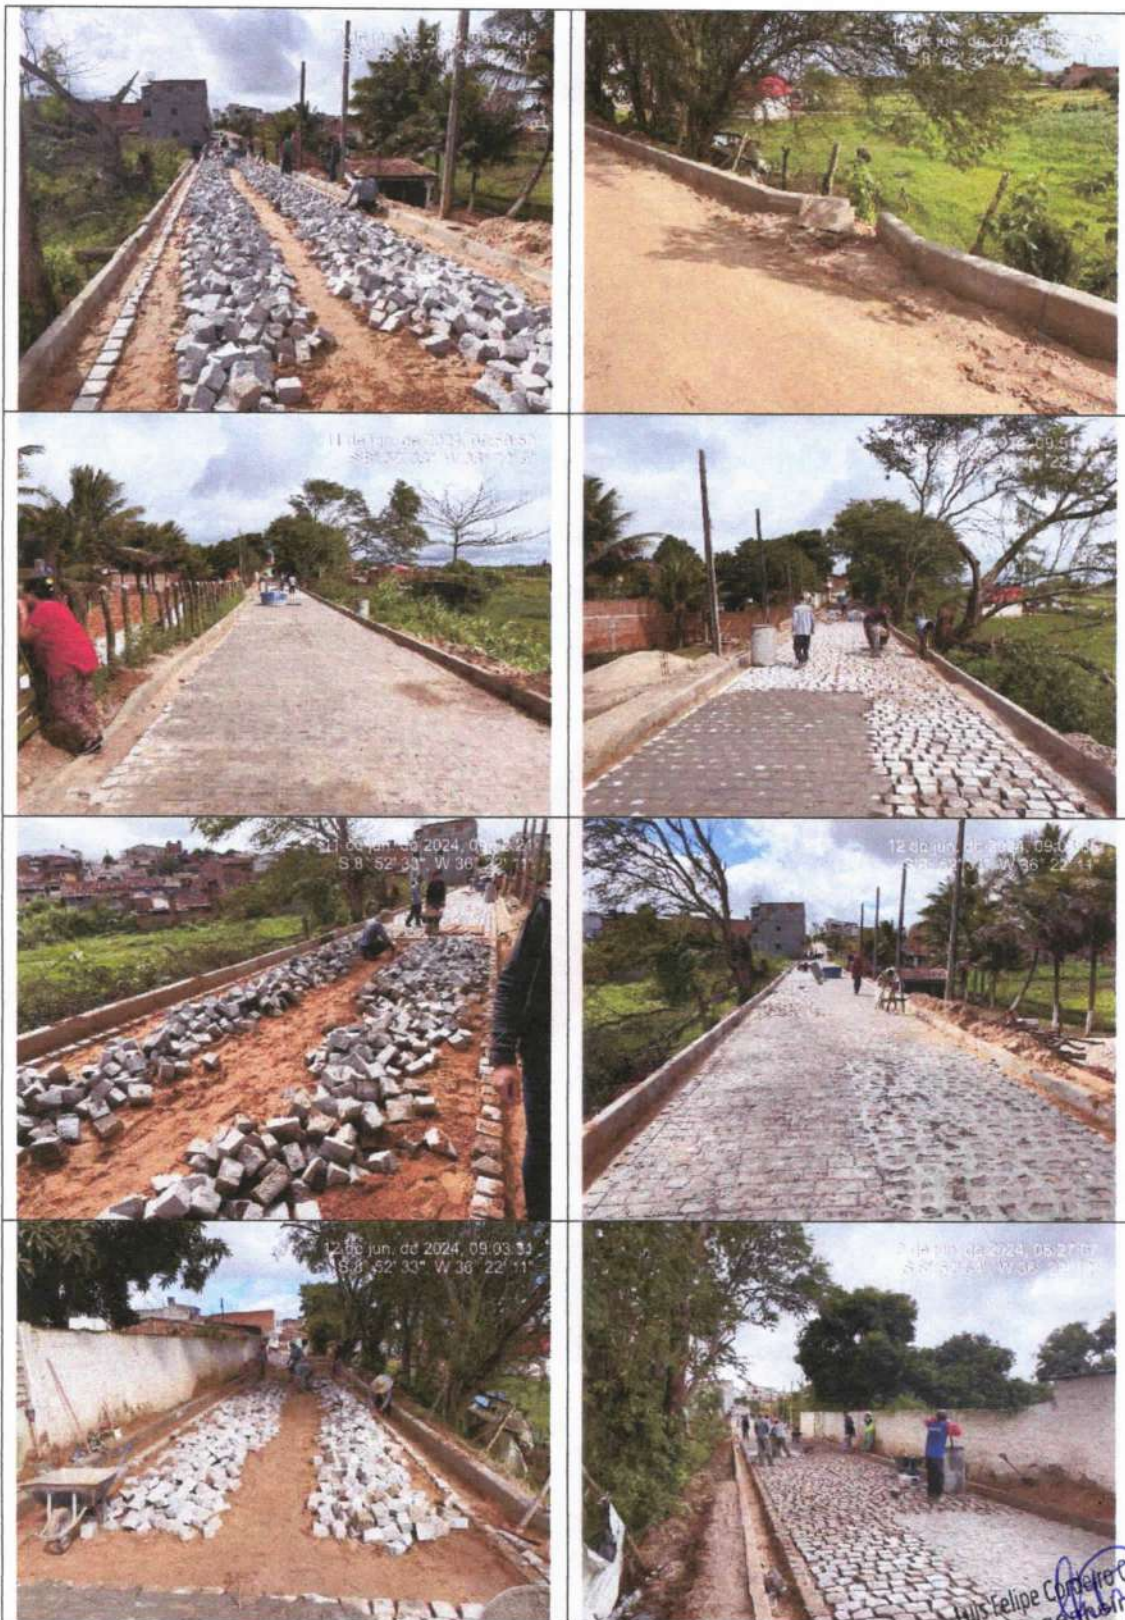

Luís Felipe Condeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

PREFEITURA DE SÃO JOÃO


Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

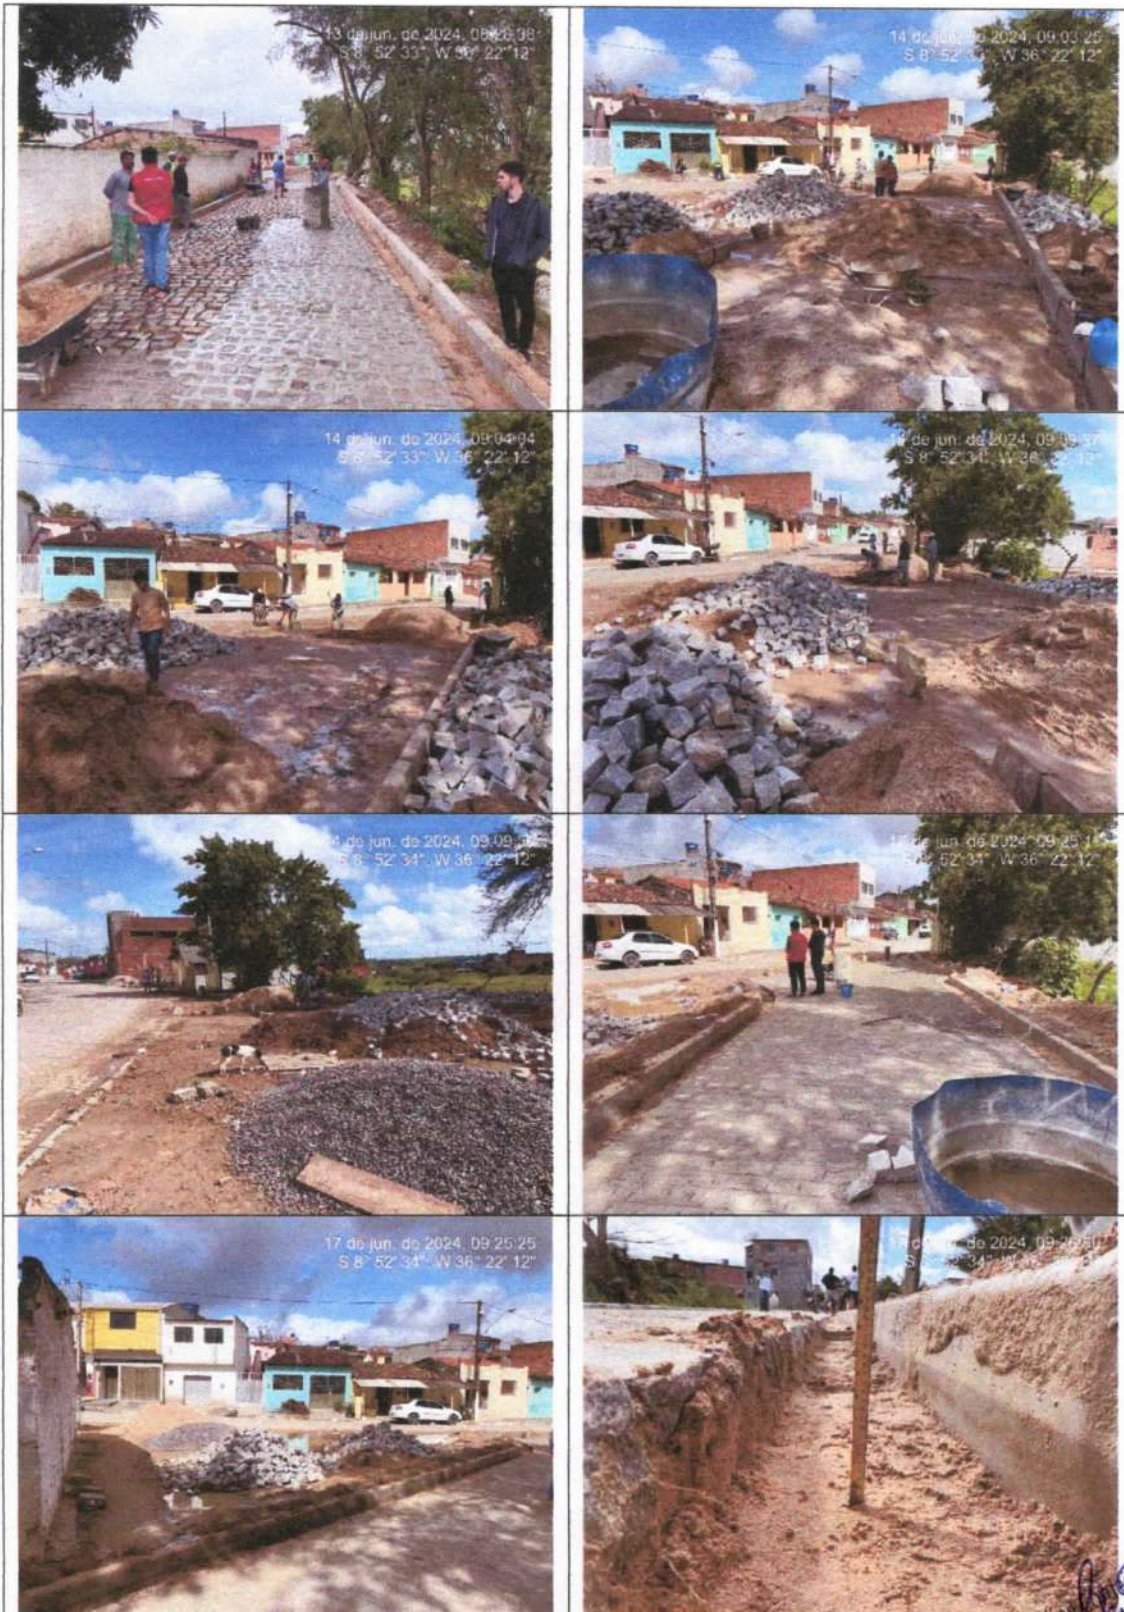

Luis Felipe Augusto Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



SÃO JOÃO

UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ENGENHARIA**



Luis Felipe Carneiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 1

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
29/05/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA
- 2)
- 3) **RUA HIGINO DA COSTA**
- 4) EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:56:18
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M.
M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:46:44
-03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 2

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
30/05/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FERIADO NACIONAL
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:56:02
+03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:47:06 -03'00'

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 3

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
31/05/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
- 3) EXECUÇÃO DE ATERRO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:55:46 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:47:24 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 4

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
03/06/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:55:32
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUÇAO DE
EDIFÍCIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:47:42 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 5

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
04/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495 Dados: 2024.06.25 08:55:16 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L:35978627000104 Dados: 2024.06.25 08:47:57 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 6

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
05/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:54:59 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
 OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:48:13 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 7

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
06/06/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:54:44
+03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:48:29 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 8

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
07/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4) EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:54:29 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
 CONSTRUCAO DE
 EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:48:44 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 9

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
10/06/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4) EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:54:16
+03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M.
M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:48:59
+03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181949871-9
CPF: 096.528.464-65
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
11/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:54:02 -03'00'

M. M. DA SILVA
 OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:49:14 -03'00'

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
12/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por DAVI WILSON LUCENA DO O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:53:48 -03'00'

M. M. DA SILVA
 OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:49:29 -03'00'

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
13/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por
 DAVI WILSON LUCENA DO
 O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:53:32
 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
 OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
 DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:49:44 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 13

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
14/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por
 DAVI WILSON LUCENA DO
 O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:53:16
 -03'00'

M. M. DA SILVA
 OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
 DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:53:02 -03'00'

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
17/06/2024



MANHÃ	X
TARDE	X
NOITE	X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:53:00
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por
M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:50:19
-03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Carneiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 481949871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 15

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
18/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por
 DAVI WILSON LUCENA DO
 O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:52:41
 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
 CONSTRUCAO DE
 EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M.
 M. DA SILVA OLIVEIRA
 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:50:39 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordero Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
19/06/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital
por DAVI WILSON LUCENA
DO O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:52:22
-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M.
M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:50:57
-03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 01949871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
20/06/2024



MANHÃ X
TARDE X
NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS
- 3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado de forma digital por
DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Dados: 2024.06.25 08:52:04
+03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS
L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO
DE EDIFICIOS L:35978627000104
Dados: 2024.06.25 08:51:13 -03'00'

CONTRATADA

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Engenheiro Civil
CREA-PE 181049871-9
CPF: 096.528.464-65

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº **18**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 ENDEREÇO: SÃO JOÃO - PE

INÍCIO: 29/05/2024

DATA:
21/06/2024



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE X

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		AJUDANTE GERAL	3	PATROL	
ENGENHEIRO DE CONST.		ARMADOR		RETRO ESCAVADEIRA	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		CARPINTEIRO		CAMINHÃO BASCULANTE	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	2	CAMINHÃO MUNCK	
COMPRADOR		SOLDADOR		GUINDASTE	
ORÇAMENTISTA		OPERADOR DE MÁQUINA		COMPACTADOR	
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR			
		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) RUA HIGINO DA COSTA
- 2) INSTALAÇÃO DAS PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA
- 3) INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)

ASSINATURAS

DAVI WILSON
 LUCENA DO
 O:01327337495

Assinado de forma digital por
 DAVI WILSON LUCENA DO
 O:01327337495
 Dados: 2024.06.25 08:51:46
 -03'00"

M. M. DA SILVA OLIVEIRA
 CONSTRUCAO DE
 EDIFICIOS
 L:35978627000104

Assinado de forma digital por M. M.
 DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO
 DE EDIFICIOS L:35978627000104
 Dados: 2024.06.25 08:51:30 -03'00"

Luis Felipe Cordeiro Oliveira Torres
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181949871-9
 CPF: 096.528.464-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.28
2625502625 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA

AGENCIA: 2625-5 CONTA: 120.125-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6989-2 - BONITO

CONTA: 6.228-6

FAVORECIDO: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 35.978.627/0001-04

VALOR: R\$ 6.582,11

DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 2.CD7.0BA.835.380.771



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.33
2625502625 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMSJ FUNDO ESPECIAL
AGENCIA: 2625-5 CONTA: 121.497-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMSJ FUNDO ESPECIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6989-2 - BONITO
CONTA: 6.228-6

FAVORECIDO: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 35.978.627/0001-04
VALOR: R\$ 110.000,00
DEBITO EM: 01/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: B.58E.BD7.946.8B8.A20

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.
