



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15									
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15									
DATA: 04/09/2024									
FOLHA: 01									
CONTRATO Nº 030/2024									
LOCAL: SALOÁ/PE									
FIRMA: J.C.M. CONSTRUTORA									
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023									
VALOR: 2.646.317,19									
ESTA MEDIÇÃO: 110.455,79									
SALDO. ANT. R\$ 1.188.948,51 SALDO ATUAL: R\$ 1.078.462,72									
Discriminação dos serviços									
1	Pavimentação em paralelepípedos								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019								
1.2	PAVIMENTAÇÃO								
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016								
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020								
1.3	SINALIZAÇÃO								
1.3.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.								
1.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.								
1.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.								
1.3.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.								
Unid.		Custo Unit.	Quantidade Previsto	Acumulado Anterior	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financeiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
M²		314,58	6,00	6,00		6,00	1.887,48	0,00	1.887,48
M²		1,31	23.776,08	13.536,81	986,34	14.523,15	31.146,66	1.292,11	19.025,33
M		60,01	7.171,92	3.943,00	356,60	4.299,60	430.386,92	21.399,57	258.019,00
M²		89,01	23.776,08	13.494,31	986,34	14.480,65	2.116.308,88	87.794,12	1.288.922,66
UNID		431,67	5,00				2.158,35	0,00	0,00
UNID		264,30	2,00				528,60	0,00	0,00
UNID		264,35	5,00				1.321,75	0,00	0,00
UNID		103,72	49,00				5.082,28	0,00	0,00

Genilson De Souza Volez
RESP. TÉCNICO
CREA 44.460.773

17.653.615/2023-62
J.C.M. CONSTRUÇÃO
RUA...
DEP: 55160-211-0001

Jão Innocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15									
DATA: 04/09/2024									
FOLHA: 01									
CONTRATO Nº 030/2024									
LOCAL: SALOÁ/PE									
FIRMA: J.C.M. CONSTRUTORA									
VALOR: 2.846.317,19									
ESTA MEDIÇÃO: 110.485,79									
SALDO. ANT. R\$ 1.188.948,51 SALDO ATUAL: R\$ 1.078.462,72									
Discriminação dos serviços									
1.4	DRENAGEM								
1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	9,17	214,88					
1.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	6,25	143,25					
1.4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	414,83	95,50					
1.4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	21,62	139,91					
1.4.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID	2.256,38	1,00					
1.4.6	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UNID	4.023,71	1,00					
1.4.7	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UNID	710,89	1,00					
1.4.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	3.816,14	1,00					
1.4.9	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPa, COM USO DE IERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M³	653,19	1,81					
TOTAL:									
							2.846.317,19	110.485,79	1.567.854,46
									59,25%

Genilson da Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 1490/PB

17.653.615/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-EPP
R. 1000, 1º andar, Jd. Santa Helena, 54030-000
Cidade de São Paulo, SP

João Ildefonso Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



MEMORIA DE CALCULO 15

OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

ITEM DESCRIÇÃO

1. Pavimentação em Paralelepípedos
1.1 Serviços Preliminares

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TAXA	TOTAL
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²						
	Rua da Compesa			-	5,40			
	E0			20,00	5,40			108,00
	E1			20,00	6,40			128,00
	E2			10,40	6,40			66,56
	E2+10,40			-	6,20			
	E0			20,00	6,20			124,00
	E1			20,00	6,20			124,00
	E2			20,00	6,20			124,00
	E3			5,40	6,20			33,48
	E3+5,40			-	7,00			
	Travessa Antonio Vicente Pisquira (trecho)							
	E0			20,00	7,00			140,00
	E1			20,00	7,00			140,00
	E2			4,50	7,00			31,50
	E2+4,50			7,00	5,80			40,60
	Cruzeamento			-	4,50			
	Travessa			20,00	4,50			90,00
	E0			20,00	4,50			90,00
	E1			20,00	4,50			90,00
	E2			20,00	4,50			90,00
	E3			3,60	4,50			16,20
	E+3,60			50,00	7,00		-1,00	-350,00
	Travessa Antonio Vicente Pisquira (trecho) - Desconto medição 14							
							TOTAL	986,34

1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M						
	Rua da compesa		2,00	50,40				100,80
			2,00	85,40				170,80
	Travessa Antonio Vicente Pisquira (9 trecho)		2,00	44,50				89,00
	Desconto			5,80		-1,00		-5,80
	Recrava			14,60				14,60
	Travessa		2,00	63,60				127,20
	Travessa Antonio Vicente Pisquira (9 trecho) - Desconto medição 14		2,00	50,00		-1,00		-100,00
							TOTAL	356,60

Genilson de Sousa Aguiar
Resp. Técnico
CREA-PA 044.000.000-0

17.653.416/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Capim, 210 - Bairro: São João
CEP: 55.000-000

João Inocêncio Guio Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/DPE



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ – PE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2023

CONTRATO N.º 030/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

-15º MEDIÇÃO-

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANÍTICOS EM DIVERSAS
VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE**

Genilson de Souto Volez
Resp. Técnico
CREA 1490/PB

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Coronel F. de S. 14, 1º andar, Centro
CEP: 55.450-210, Belo Jardim-PE



03/09/2024, 14:43
8.974154 -36.690072 ±16.04m
Rua Jose Florentino Alves, 81
Garanhuns




Genilson de Souza Vitor 12.533.810/000-15

João Manoel Guido Filho

CRICA 12.533.810/000-15

12.533.810/000-15

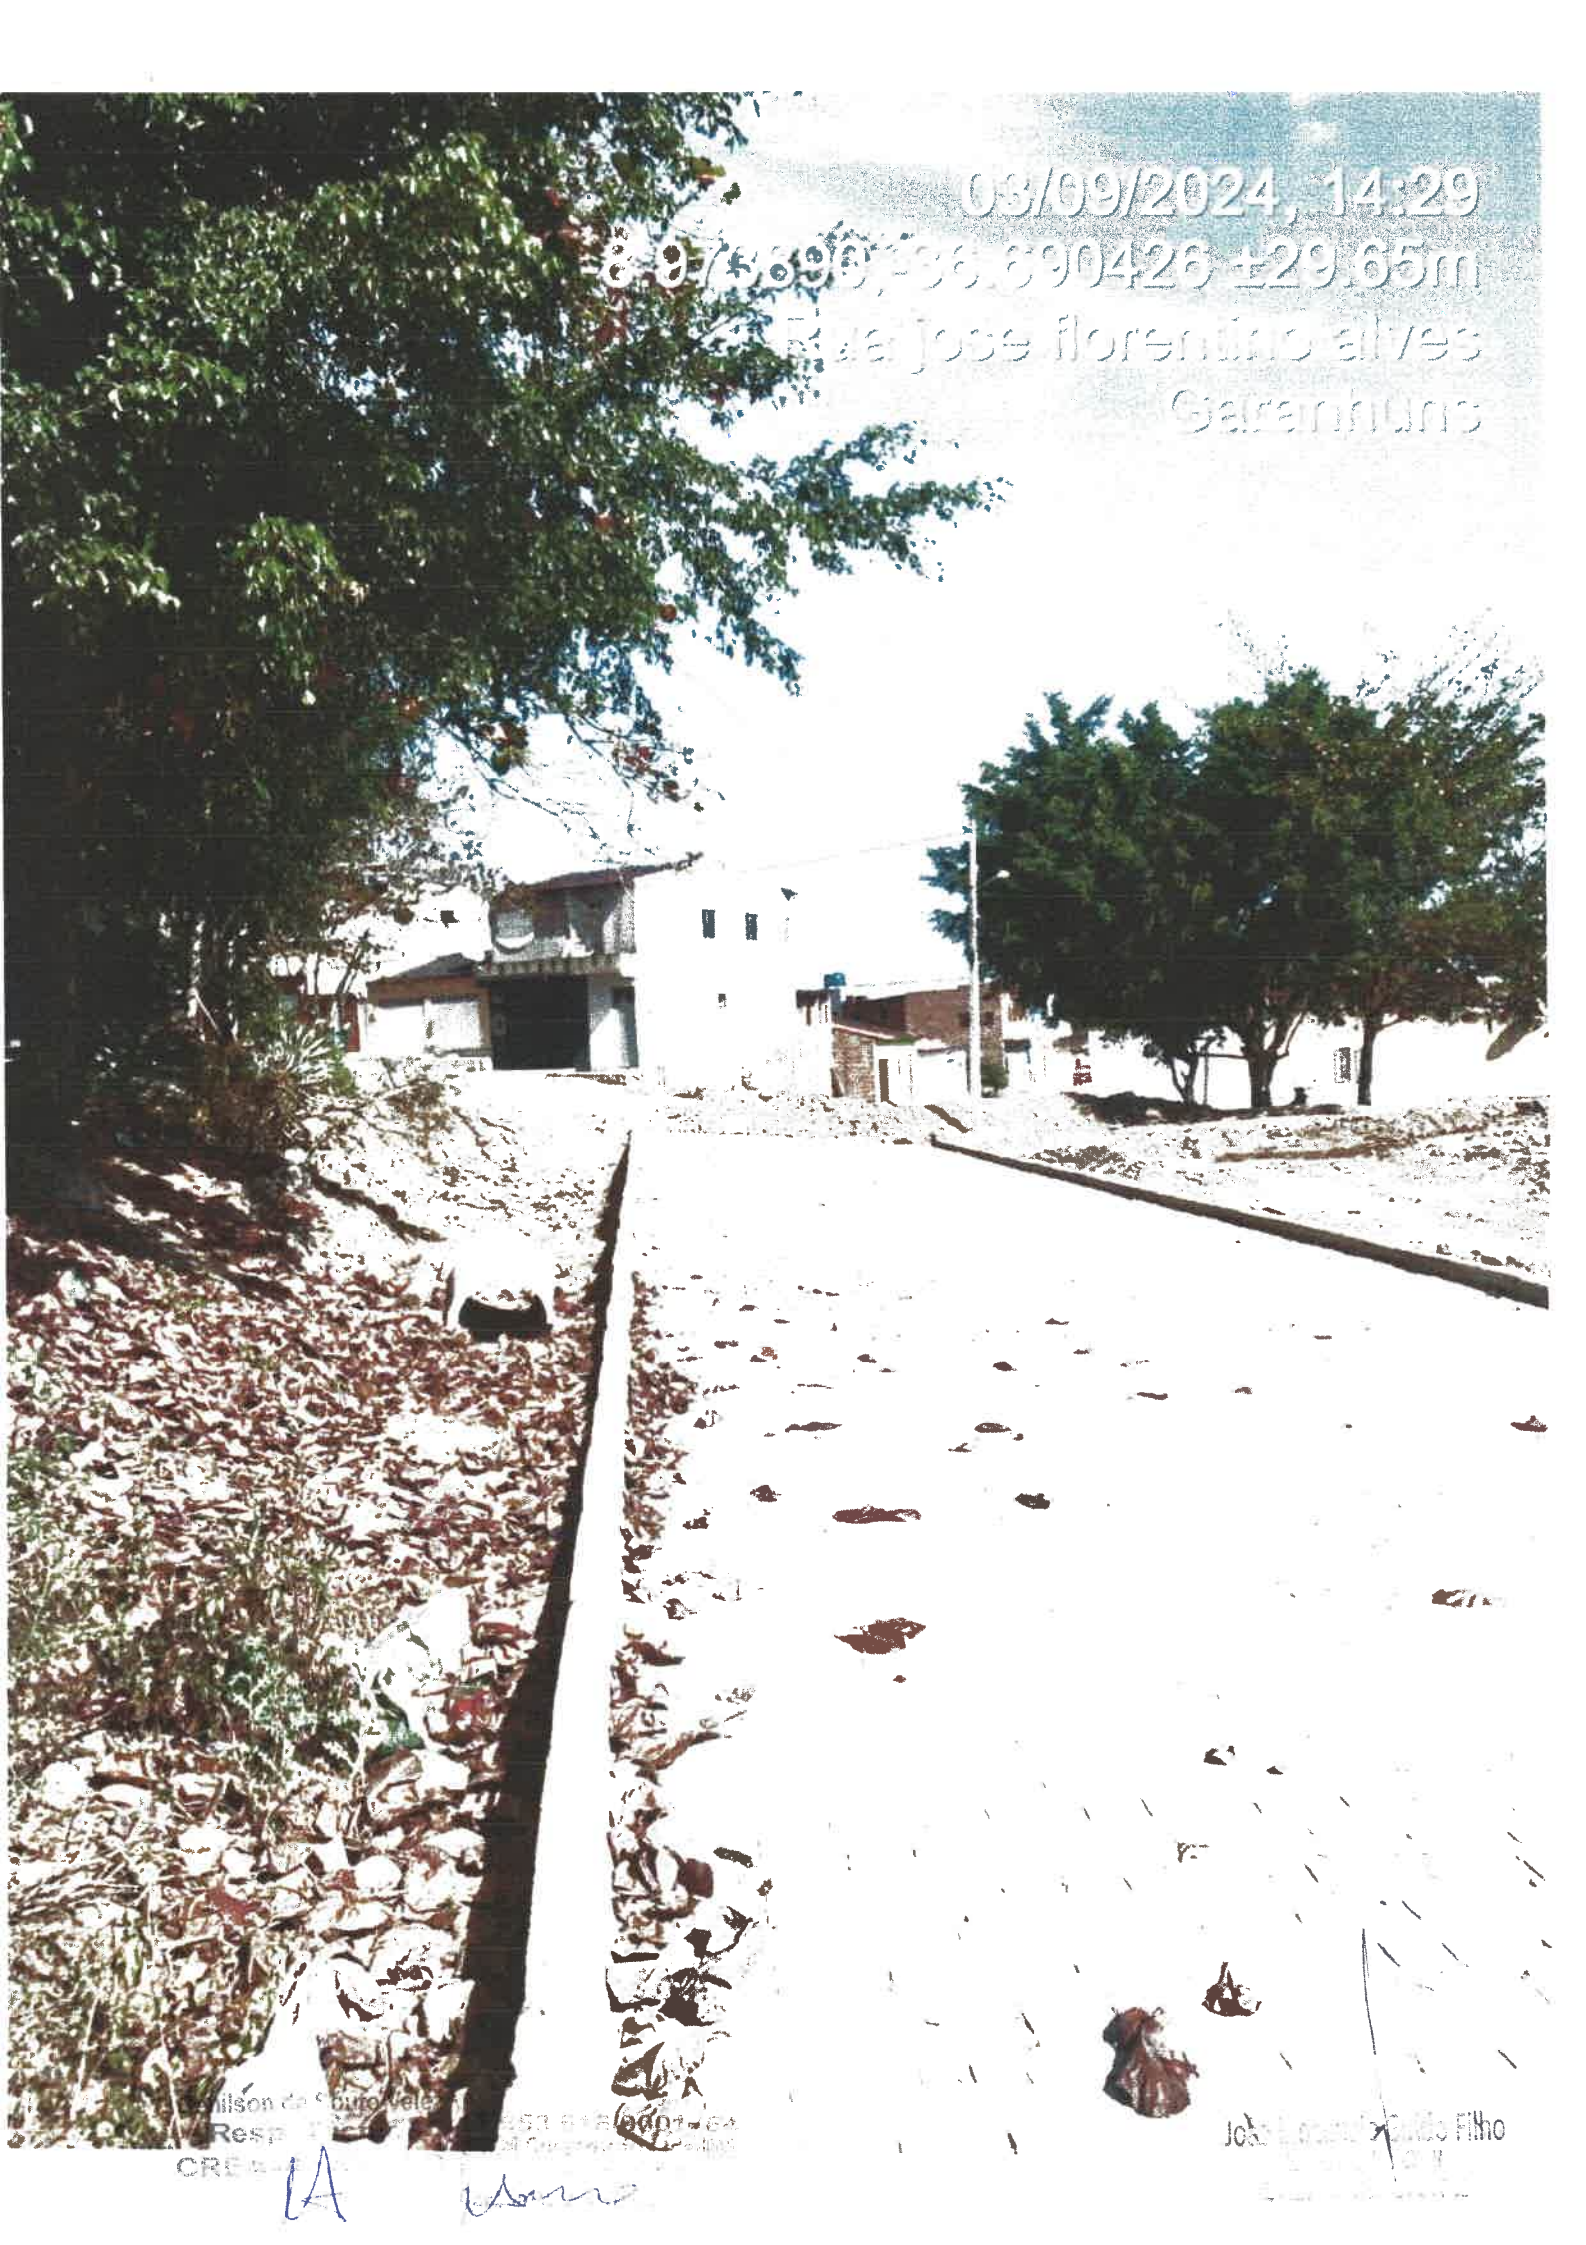

03/09/2024, 14:29
8-9/6696-36.690426 ±29.65m
Rua Jose florentino alves
Garanhuns

Wilson de Souza Velez
Resp. Técnico
CRE-PA 1A
253.812/0001-64
Eng. Civil - CREA-PA


João Roberto de Fátima Filho
Eng. Civil - CREA-PA

03/09/2024, 14:29

-8.973890, -36.690426 ±29.65m

Rua Jose florentino alves

Garanhuns

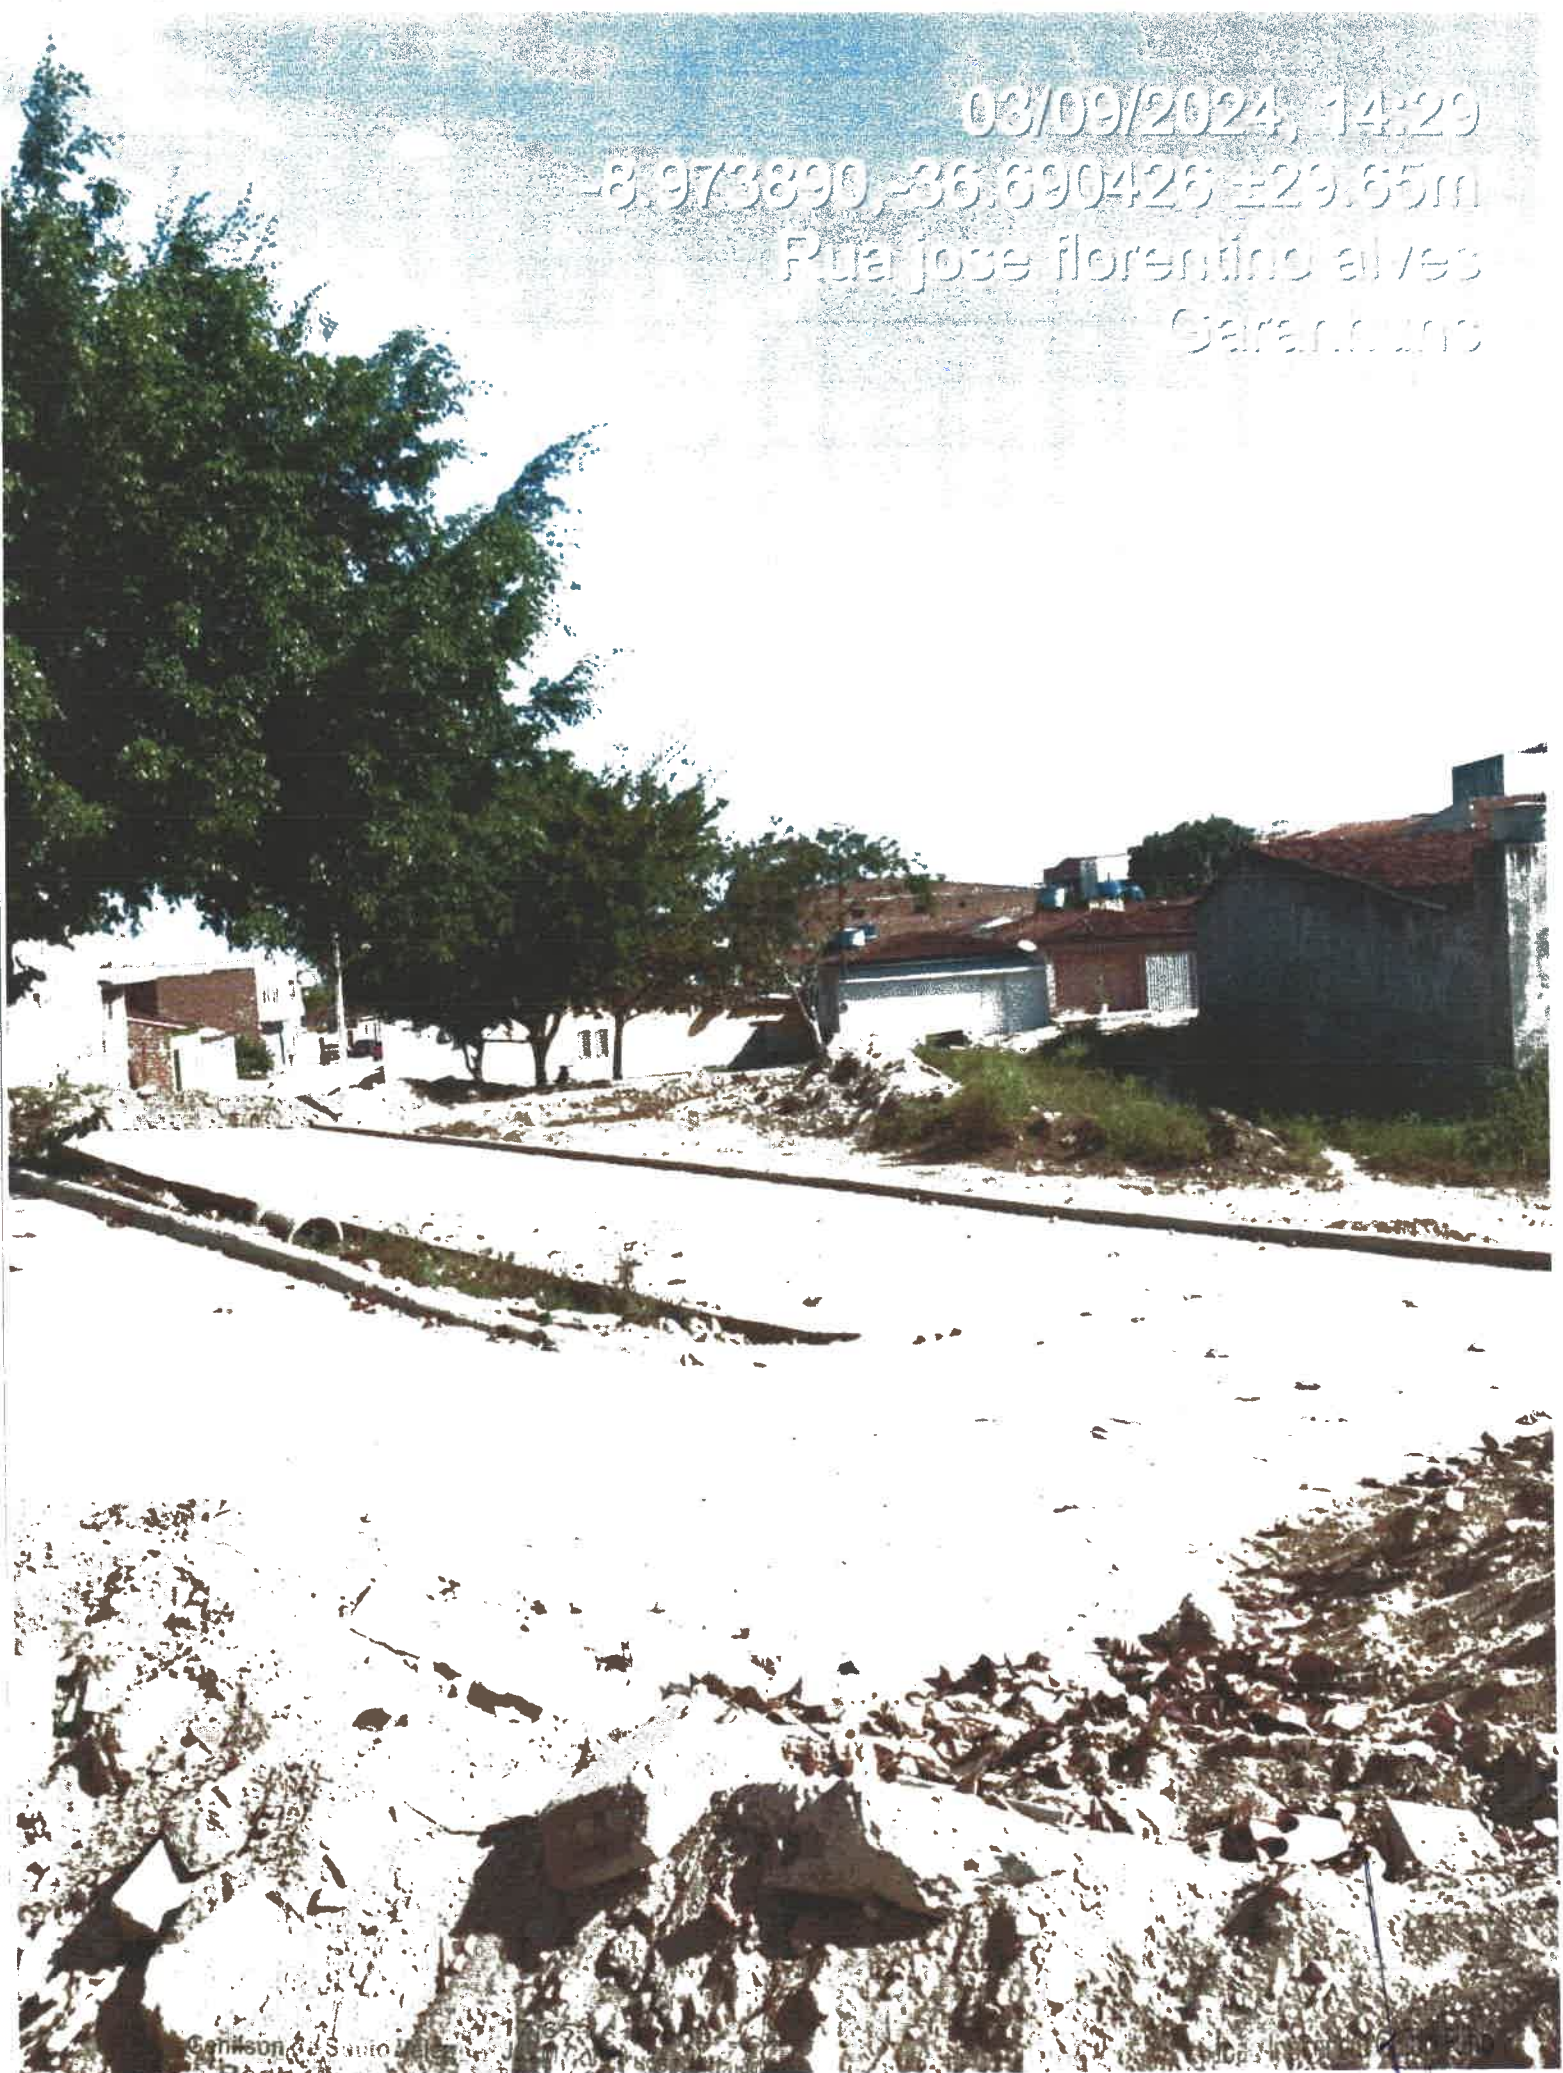



03/09/2017
-851-225, 53, 02

Genilson de Souza Velloz
Resp. Técnico

17 553 618/0001-64
J.J.M. Construção Ltda-ME

[Handwritten signature]

Trabalho Civil

53154224-7496
53154224-7496
53154224-7496




Gerência Geral de Obras e Serviços Públicos
RASP

João Inocêncio Guido Filho

CRB 41

10/01/2011

03/09/2024, 14:16
-8.971928,-36.690824 ±4.85m
Rua Oziel Vicente
Garanhuns

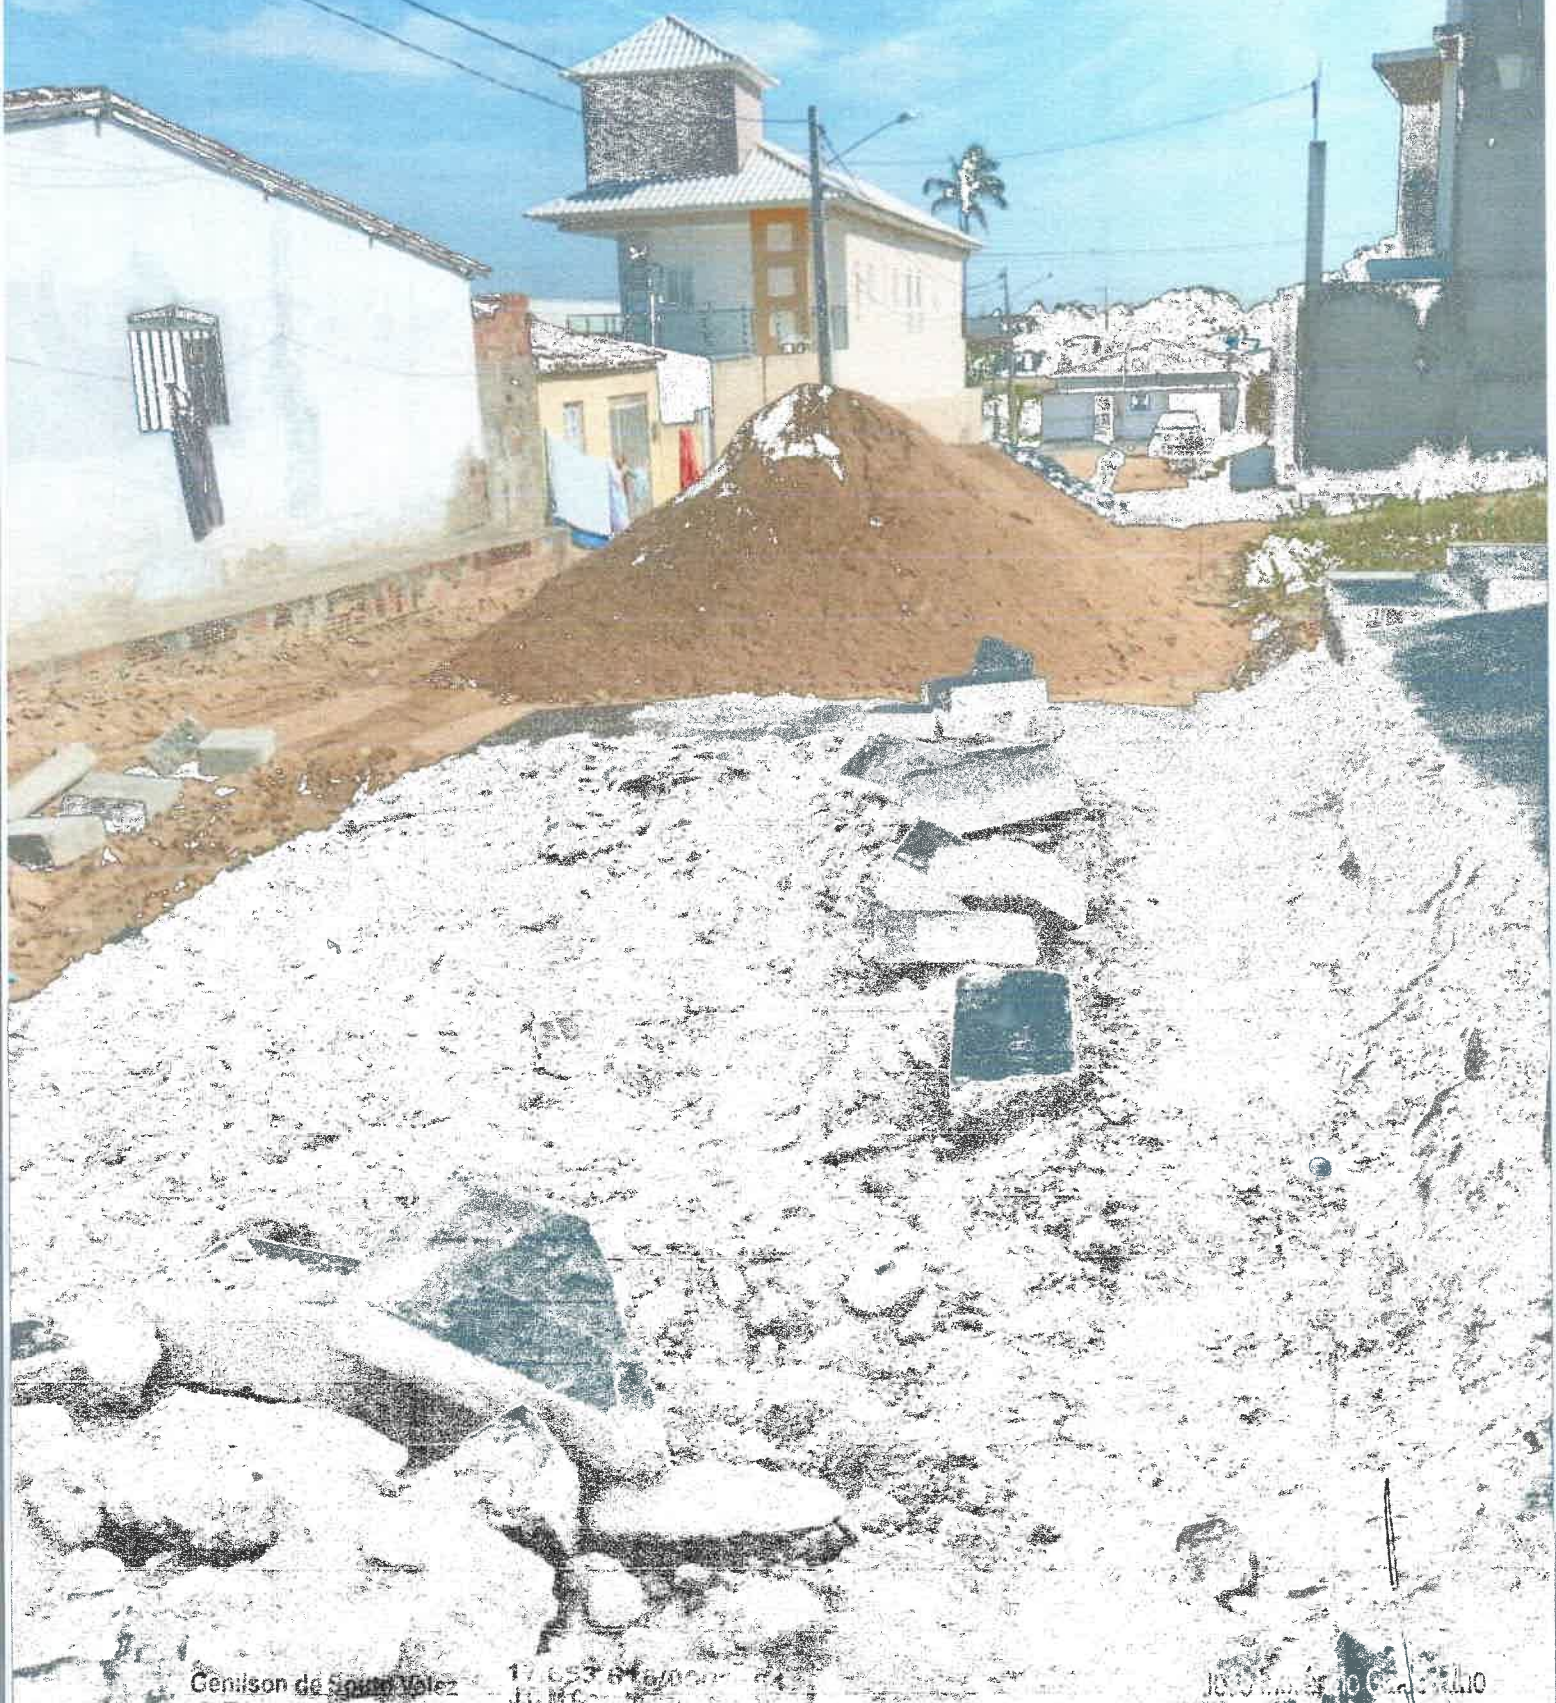

Genilson de Souza Vilez
Resp. Técnico
CREA 4149D/PB

17.053.614/0001-24
JCMC
R. Coronel Firmino Rodrigues, N. 10, Centro
CEP: 55150-240, BR
Garanhuns - PE

JOÃO CARLOS DE CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/E

250

17.653 6161000 .00

João Filho



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 21 DE AGOSTO DE 2024

INICIAMOS A REGULARIZAÇÃO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

João Inocêncio Galvão Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 22 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A REGULARIZAÇÃO DA RUA : RUA DA COMPESA

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 3149D/PB

Contratada

João Manoel Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 23 DE AGOSTO DE 2024

INICIAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS ; RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB

Contratada

João Francisco Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 26 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE
PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PB

Contratada

João Inocencio Goido Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 27 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS O ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE
PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA 149D/PB

Contratada


João Inocêncio Guido Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 00.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 28 DE AGOSTO DE 2024

INICIAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souza Velez
Resp. Técnico
CREA 4.149D/PE

Contratada


João Francisco Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.149D/PB

Contratada

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 30 DE AGOSTO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Gerilson de Souto Velez
Resp. Técnico
CREA-4.1450/PB

Contratada

João Inocêncio Guido Filho
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souza Vaz
Resp. Técnico
CREA 4.149.791-2

Contratada

José Inácio Gundo Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE



J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.653.616/0001-64

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CONTRATO 030/2024

TP 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 046/2023

CONTRATANTE: SALOÁ - PE

CONTRATADA: J.C.M. Construção Ltda - EPP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE.

DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2024

CONTINUAMOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS : RUA DA COMPESA E DA TRAVESSA ANTONIO VICENTE PISQUIRA (TRECHO)

Genilson de Souto vetez
Resp. Técnico
CREA 4.14907/PB

Contratada

João Flávio de Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE
