

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM**Secretaria de Gestão Pública****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Av. Deputado José Mendonça Bezerra N° 220 - CENTRO, CEP 55150-005 -
BELO JARDIM - PE TEL.: (81) 3726.8711 E-mail:
TRIBUTOSMERCANTIL@BELOJARDIM.PE.GOV.BR CNPJ: 10.260.222/0001-



Número da Nota:

00000428

Competência:

NOV/2024

Data e Hora Emissão:

27/11/2024 11:04:08

Código de Verificação:

QKRF-GQSQ8**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

SALOA - PE

Local da Prestação:

SALOA - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

17.653.616/0001-64

Inscrição Municipal:

9058469

Nome/Razão Social:

J.C.M. CONSTRUCAO LTDA

Endereço:

CEL. FIRMINO RODRIGUES ,CENTRO. 14 LJ 15

Município:

BELO JARDIMUF: **PE**CEP: **55150210**

E-mail:

TEL: **(81)99846-0633****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

11.455.714/0001-00

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE SALOA

Endereço:

PC SAO VICENTE, 43 CENTRO

Município:

SALOAUF: **PE**CEP: **55350000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
29.868,55

#QTD:1 - V.UND.:R\$49.780,91 - TOTAL:R\$49.780,91 - DED.:

CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 046/2023, CONTRATO N 030/2024, BM 21.
MATERIAL 60% - R\$ 29.868,55
MAO DE OBRA 40% - R\$ 19.912,36
ISS DE 5% DE 40% - R\$ 995,62
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA 4009
CONTA 13001526-7
SANTANDER

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.780,91

Atividade Prestada:

4213800 -

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
48.785,29	29.868,55	19.912,36	5,00%	995,62
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

612263499282242

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-belojardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21

DATA: 27/11/2024

FOLHA: 01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

LOCAL: SALOÁ/PE

CONTRATO Nº 030/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2023

FIRMA: J.C.M. CONSTRUTORA

VALOR: 2.848.317,19

SALDO. ANT. R\$ 578.851,66

ESTA MEDIÇÃO: 49.780,91

VALOR ATUAL: R\$ 529.070,75

Discriminação dos serviços

1	Pavimentação em paralelepípedos	Unid.	Custo Unit.	Quantidade Previsto	Acumulado Anterior	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Financeiro previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período	Desvio (%)
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	314,58	6,00	6,00		6,00	1.887,48	0,00	1.887,48	100,00%
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	1,31	23.776,08	19.235,06	464,95	19.700,01	31.146,66	609,08	25.807,01	82,86%
1.2	PAVIMENTAÇÃO										
1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,01	7.171,92	5.533,25	129,80	5.663,05	430.386,92	7.789,30	339.839,63	78,96%
1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	89,01	23.776,08	19.192,56	464,92	19.657,48	2.116.308,88	41.382,53	1.749.712,29	82,68%
1.3	SINALIZAÇÃO										
1.3.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1- LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213855.	UNID	431,67	5,00				2.158,35	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213440.	UNID	264,30	2,00				528,60	0,00	0,00	0,00%
1.3.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. CONFORME SICRO 07/2023 5213444.	UNID	264,35	5,00				1.321,75	0,00	0,00	0,00%
1.3.4	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 X 20 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. CONFORME SINAPI 09/2023 95541.	UNID	103,72	49,00				5.082,28	0,00	0,00	0,00%

17.653.616/0001-64
J.C.M. Construção Ltda-ME
R. Coronel Francisco de A. Silva, 100
CEP: 55010-000 - São Paulo, PE

Genilson Jorge de Alencar Velez
Engº Civil
CREA 48.354 - D/P/E

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21													
DATA: 27/11/2024													
FOLHA: 01													
CONTRATO Nº 030/2024													
LOCAL: SALOÁ/PE													
FIRMA: J.C.M CONSTRUTORA													
VALOR: 2.846.317,19													
ESTA MEDIÇÃO: 49.780,91													
Unid.													
Custo Unit.													
Quantidade Previsto													
Acumulado Anterior													
Medido no período													
Acumulado incluindo o período													
Financeiro previsto													
Medido no período													
Acumulado incluindo o período													
Desvio (%)													
1.4	DRENAGEM												
1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	9,17	214,88				1.970,45	0,00	0,00	0,00%		
1.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	6,25	143,25				895,31	0,00	0,00	0,00%		
1.4.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	414,83	95,50				39.616,27	0,00	0,00	0,00%		
1.4.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	21,62	139,91				3.024,85	0,00	0,00	0,00%		
1.4.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID	2.256,38	1,00				2.256,38	0,00	0,00	0,00%		
1.4.6	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UNID	4.023,71	1,00				4.023,71	0,00	0,00	0,00%		
1.4.7	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UNID	710,89	1,00				710,89	0,00	0,00	0,00%		
1.4.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	3.816,14	1,00				3.816,14	0,00	0,00	0,00%		
1.4.9	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M³	653,19	1,81				1.182,27	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL:										2.846.317,19	49.780,91	2.117.246,42	80,01%

Genilson Jorge de Alencar Velez
Eng Civil
CREA 48.354 - D/PE

Jão Inácio Guido Vilho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

OBJETIVO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

ITEM DESCRIÇÃO




1. Pavimentação em Paralelepípedos
1.1 Serviços Preliminares

UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALTURA	TAXA	TOTAL
M²						
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019					
Rua Projetada 02 - Jaqueirao						
E0			7,00			
E1		20,00	7,00			
E2		20,00	7,00			
E3		20,00	7,00			
E4		20,00	7,00			140,00
E4+15		15,00	7,00			105,00
Rua Projetada 03 - Jaqueirao						
E0			6,80			
E1		20,00	6,80			136,00
E1+9,50		9,50	6,80			64,60
E0			6,80			
E3		3,00	6,10			19,35
TOTAL						464,95

1.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M				
Rua Projetada 02 - Jaqueirao		2,00	35,00			138,70
Desconto Rua Projetada 03			6,80			6,00
Rua Projetada 03 - Jaqueirao		2,00	33,30			-42,00
TOTAL						102,70

1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²				
Rua Projetada 02 - Jaqueirao						
E0			7,00			
E1		20,00	7,00			
E2		20,00	7,00			
E3		20,00	7,00			
E4		20,00	7,00			140,00
E4+15		15,00	7,00			105,00
Rua Projetada 03 - Jaqueirao						
E0			6,80			
E1		20,00	6,80			136,00
E1+9,50		9,50	6,80			64,60
E0			6,80			
E3		3,00	6,10			19,35
TOTAL						464,95

Relatório fotográfico

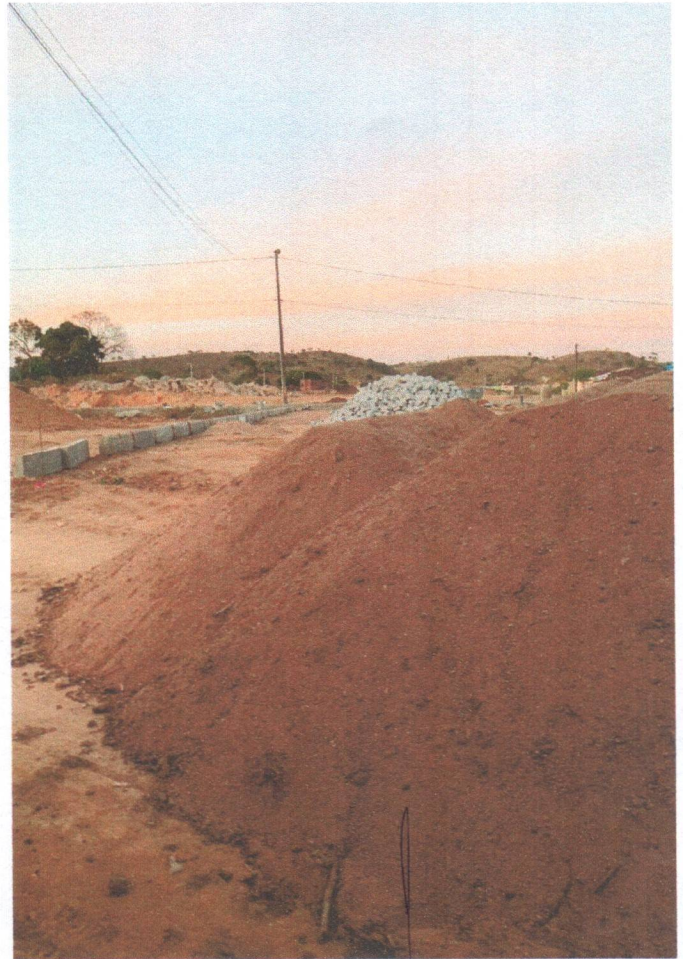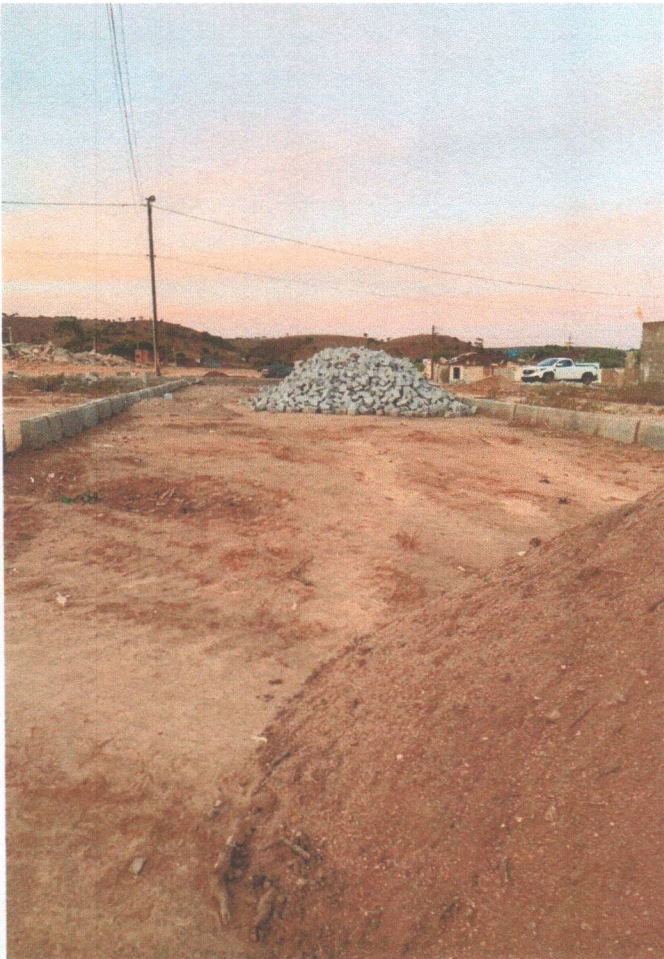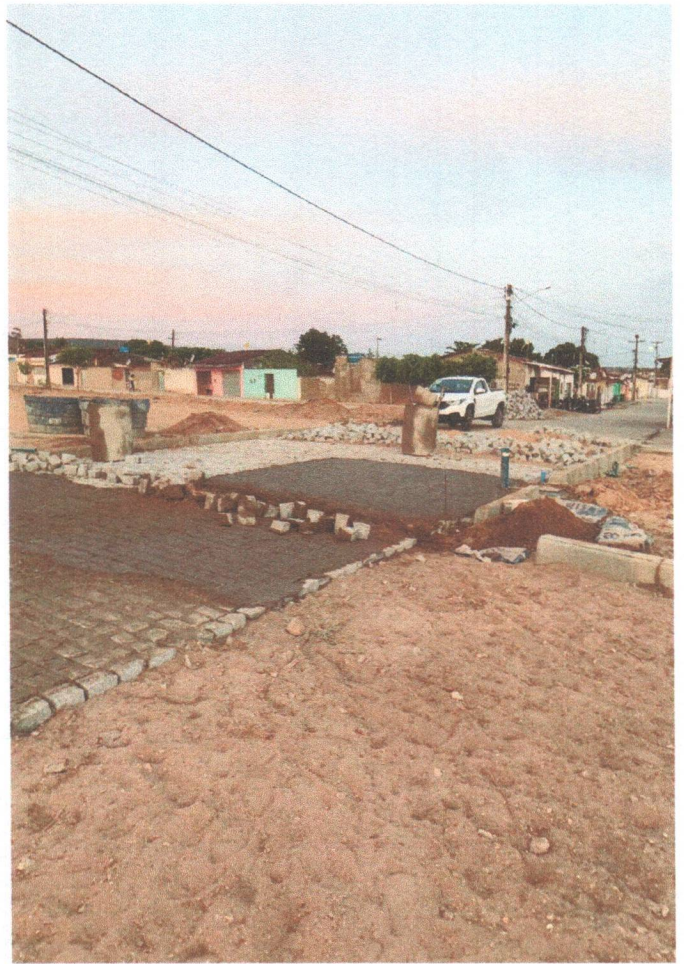


Engenheiro Civil
R. Coronel Firmino Rodrigues, N° 14 Centro
CEP: 55150-410
Handwritten signature

Genilson Jorge de Alencar Velez
Eng° Civil
CREA 48.354 - D/PE

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA n° 60.497D/PE

Relatório fotográfico

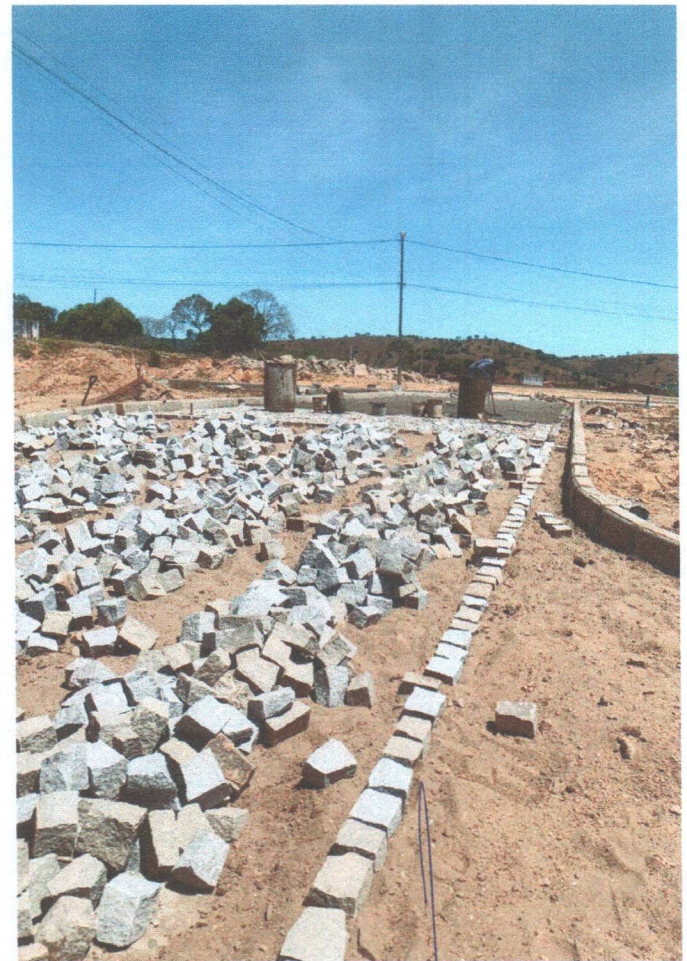

11 33 516/0001-54
J.C.M Construção Ltda-ME
R. Coronel Figueira, 11 - Centro
CEP: 65100-000

Genilson Jorge de Alencar Velez
Engº Civil
CREA 48.354-D/PE

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE
