

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01**

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA- PE

Contratada: SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 14.741.760/0001-64.

Contrato Nº	017/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	CONTRATO:	R\$	93.684,64
Início da obra:	17 de Junho de 2022		V. medido:	R\$	49.343,22
Término da obra:	16 de Agosto de 2022		V. acumulado:	R\$	49.343,22
Período:	17/06/2022 a 28/06/2022		SALDO:	R\$	44.341,41


ITEM	SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAME	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,50	488,09	488,09	488,09	1.708,32	1.708,32	1.708,32	100,00%	
1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,53	488,09	488,09	488,09	3.675,32	3.675,32	3.675,32	100,00%	
1.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	3,67	488,09	488,09	488,09	1.791,29	1.791,29	1.791,29	100,00%	
1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA	m²	45,72	15	15,00	15,00	685,80	685,80	685,80	100,00%	
1.6	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	33,87	18	18,00	18,00	609,66	609,66	609,66	100,00%	
2	COBERTA						8.470,38	8.470,38	8.470,38	100,00%	
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA	m²	24,97	488,09	488,09	488,09	12.187,61	12.187,61	12.187,61	100,00%	
2.2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	24,38	488,09	488,09	488,09	11.899,63	11.899,63	11.899,63	100,00%	
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,65	52	52,00	52,00	11.109,80	11.109,80	11.109,80	100,00%	
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO.	m²	109,15	52	52,00	52,00	5.675,80	5.675,80	5.675,80	100,00%	
2.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°.	m²	72,31	488,09			35.293,79	-	-	0,00%	
2.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	110,42	36			3.975,12	-	-	0,00%	
2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	108,48	6			650,88	-	-	0,00%	
2.8	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	75,16	58,83			4.421,66	-	-	0,00%	
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>85.214,29</b>	<b>40.872,84</b>	<b>40.872,84</b>	<b>47,96%</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>93.684,64</b>	<b>49.343,22</b>	<b>49.343,22</b>	<b>52,67%</b>

Importa a presente medição o Valor de R\$ 49.343,22 (Quarenta e nove mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos).

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 5988,ARTIGO 184, DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A

Diego Moura Cavalcante  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 17386486-D


Nilton Cesar R. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 060524

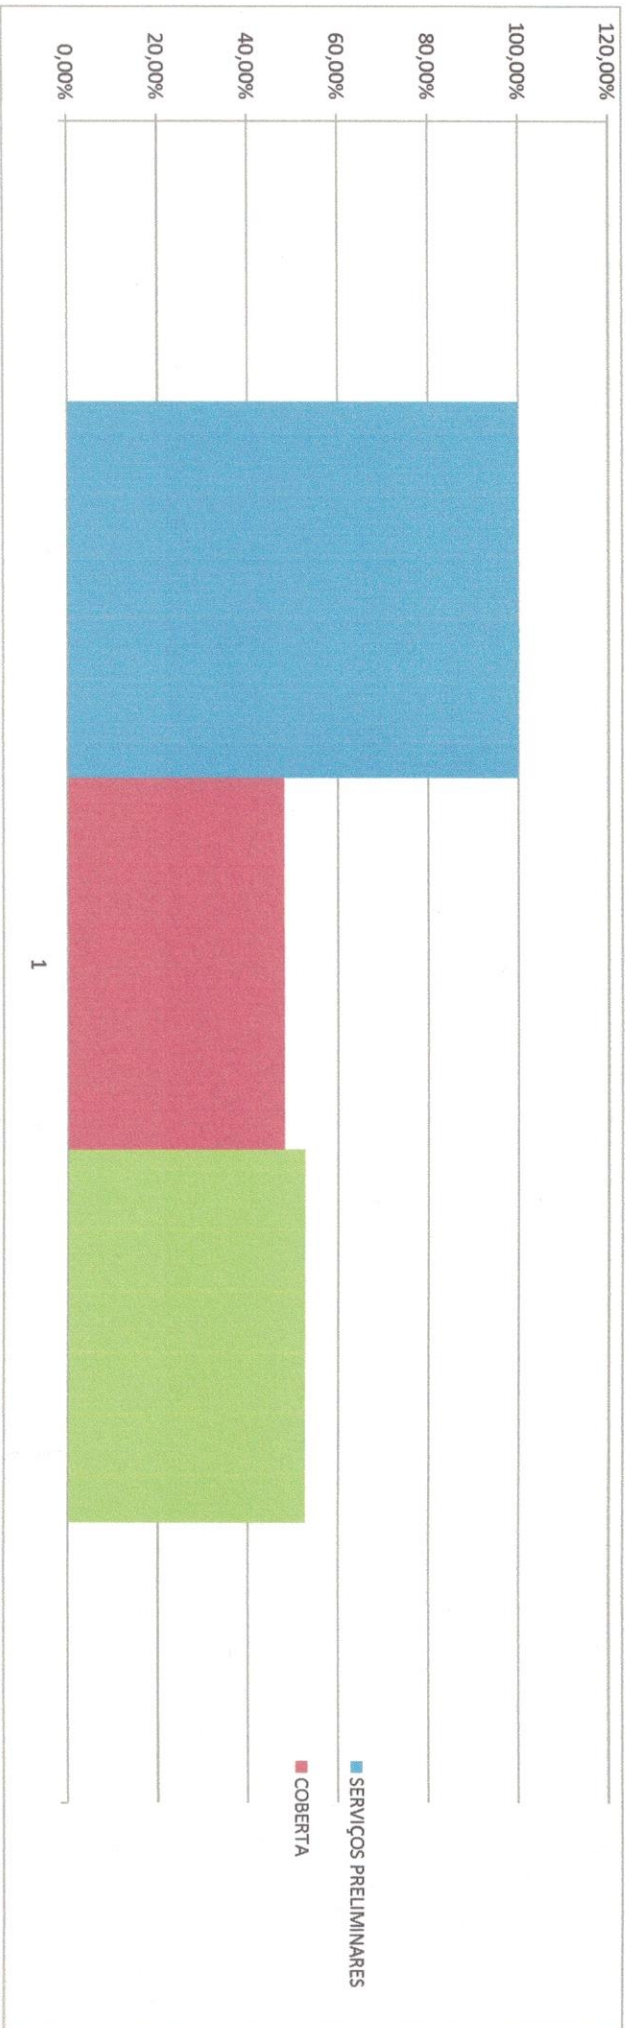

Diego Moura Cavalcante  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 07386486-D

Nilton Cesar R. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 080524

# SUB-TOTAL acumulado



■ SUB-TOTAL

Diego Moura Cavalcante  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 17386486-D

Nilton Cesar R. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 060524
