

OBJETO:

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA- PE

Contratada:

SUIJA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 14.741.760/0001-64.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Contrato Nº

017/2022

BOLETIM DE
MEDIÇÃO

Nº 02

CONTRATO:

R\$

93.684,64

V. medido:

R\$

44.341,41

V. acumulado:

R\$

93.684,64

SALDO:

R\$

-

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

Início da obra: 17 de Junho de 2022

Término da obra: 16 de Agosto de 2022

Período: 13/07/2022 a 18/07/2022


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,50	488,09		488,09	1.708,32	-	1.708,32	100,00%
1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	7,53	488,09		400,00	3.075,32		3.075,32	100,00%
1.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	3,67	488,09		488,09	1.791,29	-	1.791,29	100,00%
1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	45,72	15		15,00	685,80	-	685,80	100,00%
1.6	ADITIVO LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	33,87	18		18,00	609,66	-	609,66	100,00%
2	COBERTA						8.470,38	-	8.470,38	100,00%
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	m²	24,97	488,09		488,09	12.187,61	-	12.187,61	100,00%
2.2	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	24,38	488,09		488,09	11.899,63	-	11.899,63	100,00%
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2010	M	213,65	52		52,00	11.109,80	-	11.109,80	100,00%
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	109,15	52		52,00	5.675,80	-	5.675,80	100,00%
2.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	72,31	488,09		488,09	35.293,79	35.293,79	35.293,79	100,00%
2.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	110,42	36		36,00	3.975,12	3.975,12	3.975,12	100,00%
2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	108,48	6		6,00	650,88	650,88	650,88	100,00%
2.8	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	75,16	58,83		58,83	4.421,66	4.421,66	4.421,66	100,00%
							85.214,29	44.341,45	85.214,29	100,00%
							93.684,64	44.341,41	93.684,64	100,00%

Importa a presente medição o Valor de R\$ 44.341,41 (Quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos).


É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184 ,DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

49.343,22


Nilton Cesar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524

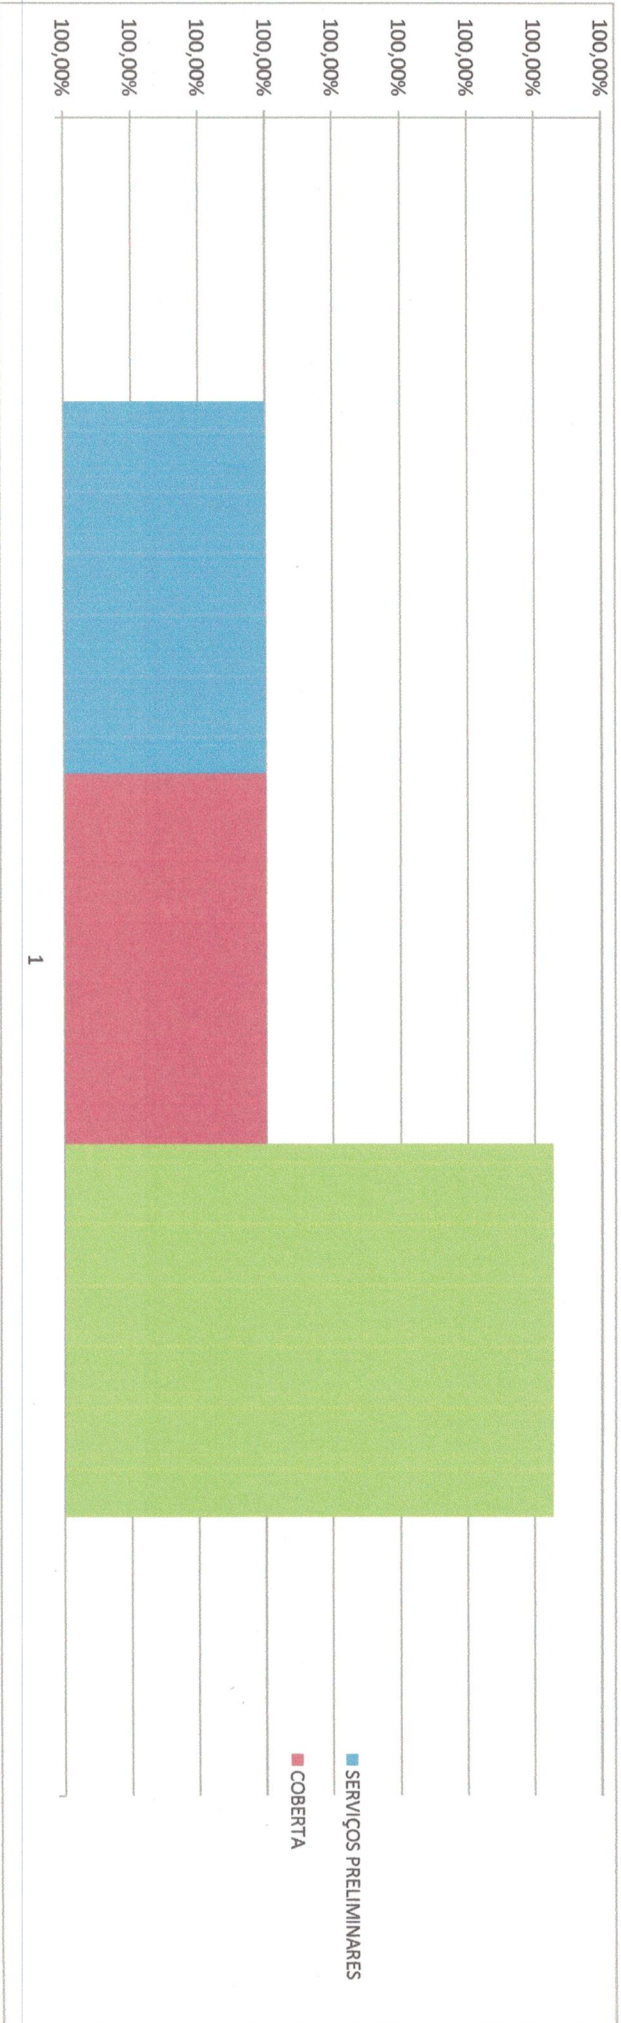

1


 Nilton César R. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 060524

SUB-TOTAL acumulado



■ SUB-TOTAL

Nilton Cesar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524
