



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03


SECRETARIA DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

OBJETO:	OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE		
Contratada:	SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.036.693/0001-01.		
Processo Nº	PROCESSO Nº 011/2022, TP Nº 01/2022	CONTRATO Nº:	015/2022
Início da obra:	21/03/2022	CONTRATO:	R\$ 417.298,30
Término da obra:	21/03/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº	04
Período: 27/04/2023 a 30/08/2023		V. medido:	R\$ 104.656,00
		V. acumulado:	R\$ 258.898,67
		SALDO:	R\$ 158.399,63

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE, AF_11/2017	M	10,98	200,00						
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	60,41	20,00			2.196,00	-	-	0,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍEDO	m²	54,81	5000,00	1600,00	3.958,09	274.050,00	87.696,00	216.942,91	79,16%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,60	5000,00	1600,00	3.958,09	53.000,00	16.960,00	41.955,75	79,16%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	79,75	500,00			39.875,00	-	-	0,00%
1.6	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00			19.400,00	-	-	0,00%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00			22.358,10	-	-	0,00%
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1,70	2520,00			4.284,00	-	-	0,00%
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3,09	300,00			927,00	-	-	0,00%
TOTAL						SUB-TOTAL	417.298,30	104.656,00	258.898,67	62,04%
Importa a presente medição o Valor de R\$104.656,00 (Cento e quatro mil seiscientos e cinquenta e seis reais)							417.298,30	104.656,00	258.898,67	62,04%
							417.298,30	25,08%	62,04%	

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184 ,DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

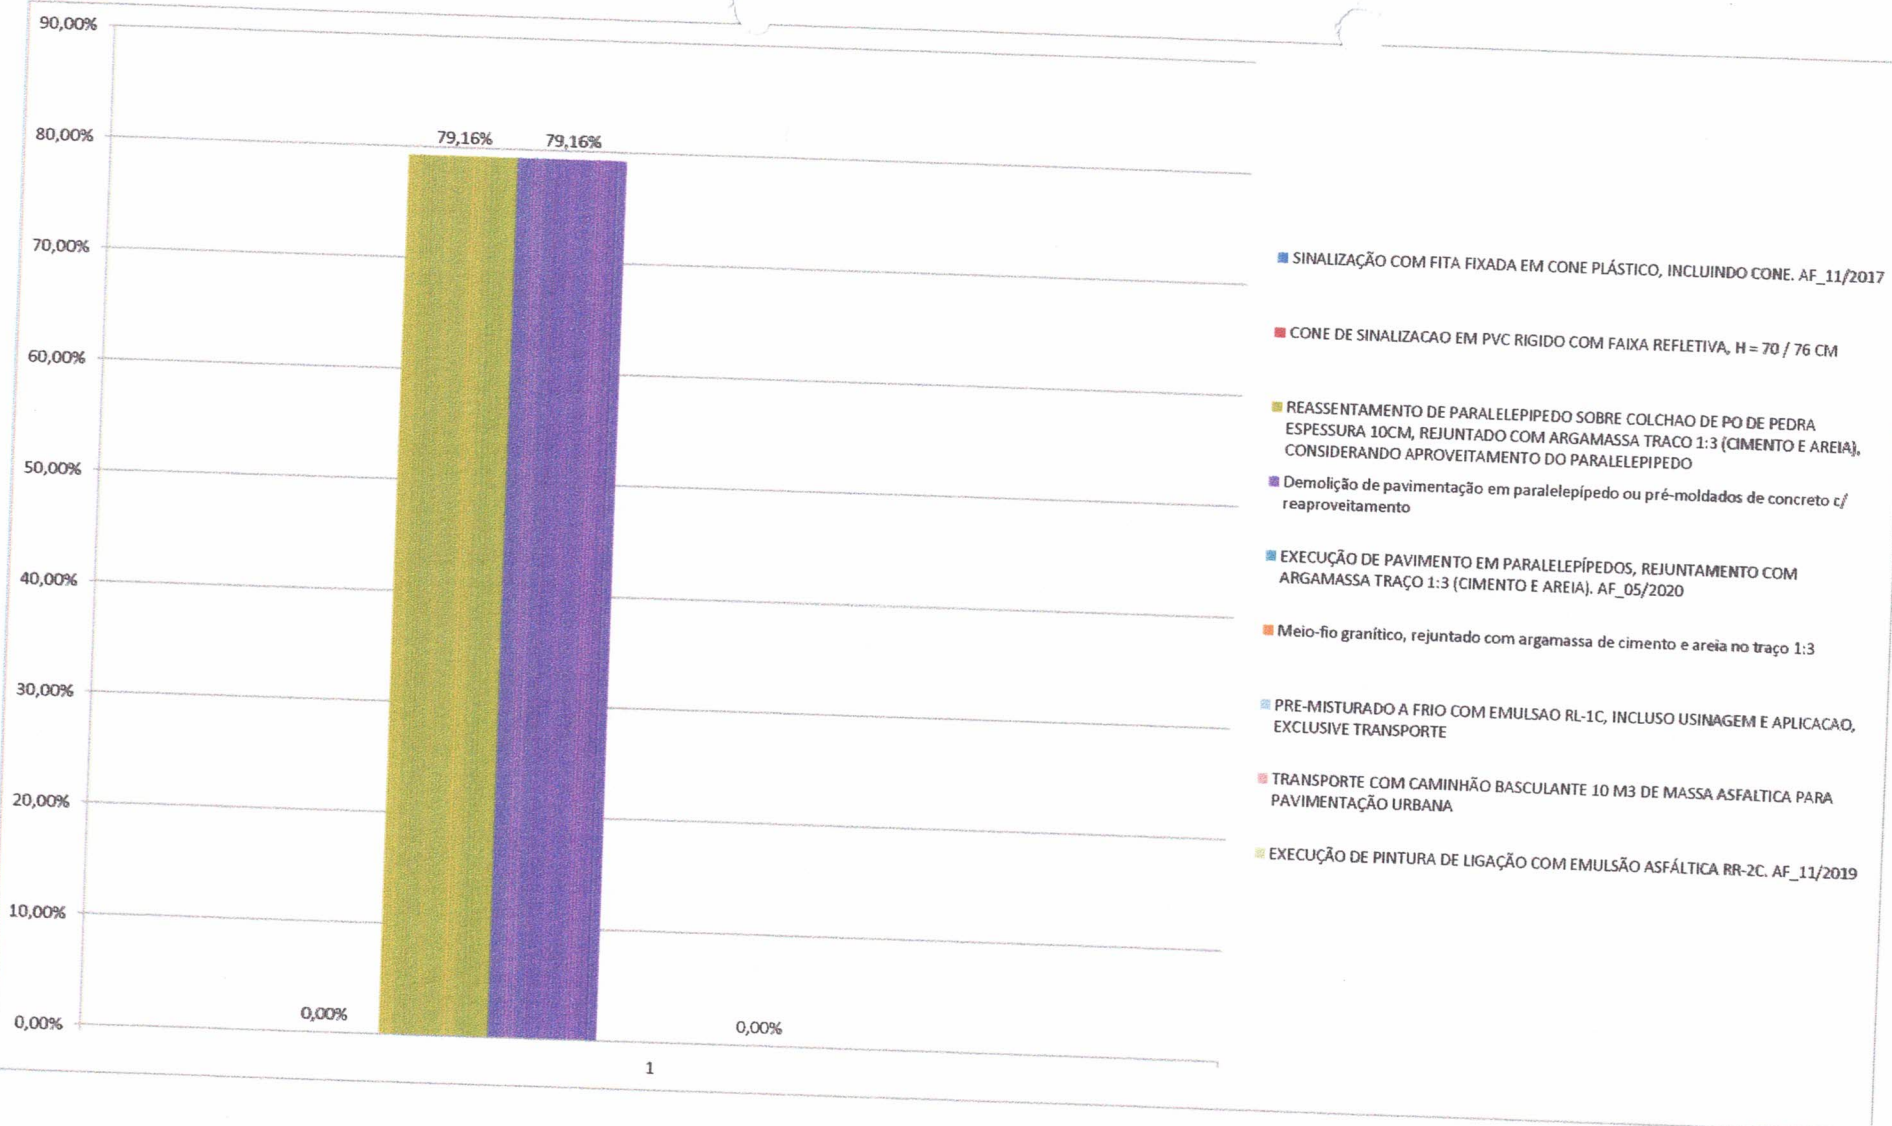

Documento assinado digitalmente
THIAGO AMORIM DE MOURA
 Data: 31/08/2023 07:44:31-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

TAMIRES PEREIRA SOARES
 PIRES:10685479447

Assinado de forma digital por
TAMIRES PEREIRA SOARES
 PIRES:10685479447
 Dados: 2023.08.31 07:53:22 -03'00'
