



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE OBRAS


BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05

OBJETO:	OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE		
Contratada:	SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.036.693/0001-01.		
Processo Nº	PROCESSO Nº 011/2022, TP Nº 01/2022	CONTRATO Nº:	015/2022
		CONTRATO:	R\$ 509.029,55
Início da obra:	21/03/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº	V. medido: R\$ 55.854,91
Término da obra:	21/03/2023	05	V. acumulado: R\$ 314.753,57
Período:	31/08/2023 a 05/12/2023		SALDO: R\$ 194.275,98

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO. INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	10,98	200,00			2.196,00	-	-	0,00%
1.2	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	60,41	20,00			1.208,20	-	-	0,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	54,81	6250,00	853,92	4.812,01	342.562,50	46.803,36	263.746,27	76,99%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,60	6250,00	853,92	4.812,01	66.250,00	9.051,55	51.007,31	76,99%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	79,75	625,00			49.843,75	-	-	0,00%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00			19.400,00	-	-	0,00%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIJO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00			22.358,10	-	-	0,00%
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1,70	2520,00			4.284,00	-	-	0,00%
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3,09	300,00			927,00	-	-	0,00%
						SUB-TOTAL	509.029,55	55.854,91	314.753,57	61,83%
			TOTAL				509.029,55	55.854,91	314.753,57	61,83%
							509.029,55	10,97%	61,83%	

Importa a presente medição o Valor de R\$55.854,91 (Cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos)

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184 ,DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

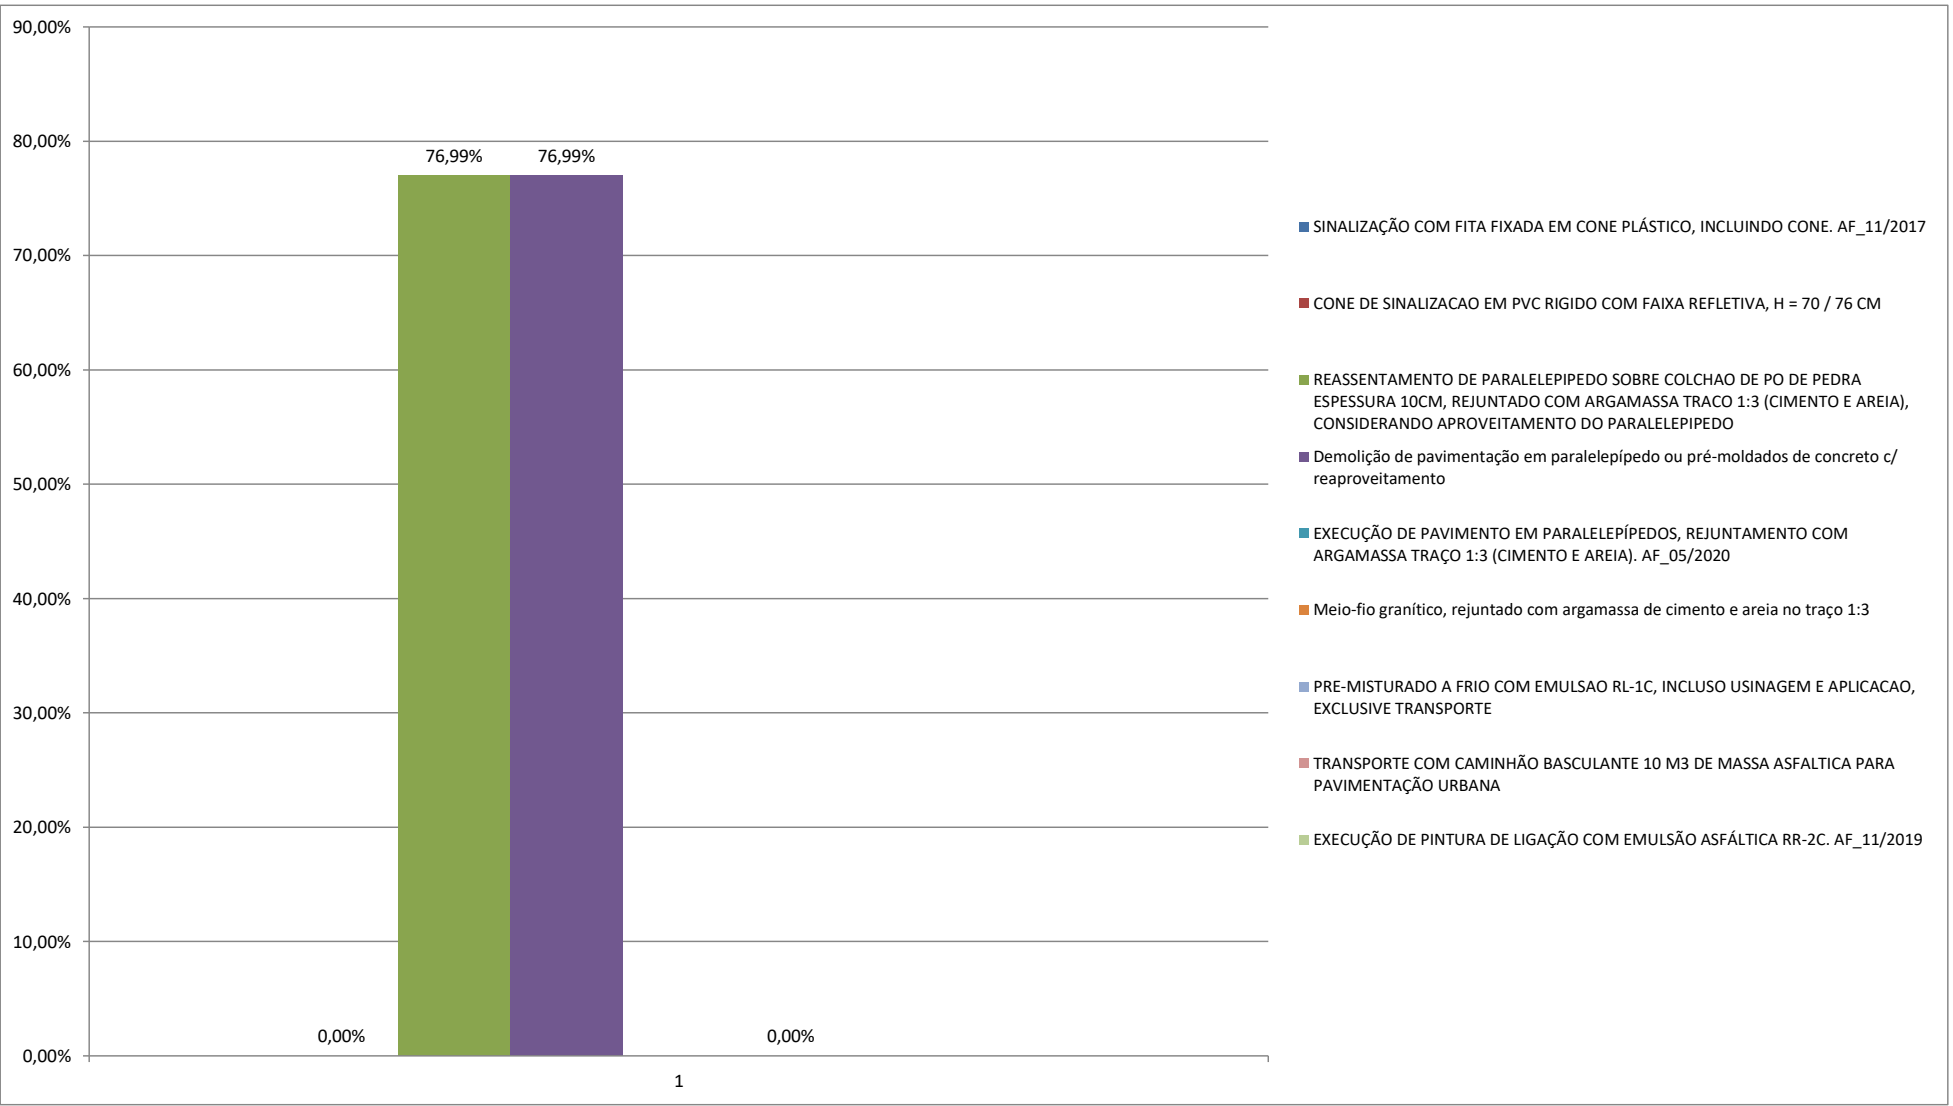

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Nome da Rua	Total em m ²
Rua Osvaldo José Monteiro	55,60 m ²
Rua São Cristovão	36,28 m ²
Rua Aristides Neres Monteiro	23,64 m ²
Rua Inácio Lucio de Oliveira	167,40 m ²
Cohab 3	571 m ²
