



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.386.267/0001-03

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada: SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.036.693/0001-01.

Processo Nº	PROCESSO Nº 011/2022, TP Nº 01/2022	CONTRATO Nº:	CONTRATO Nº: 015/2022	CONTRATO:	R\$ 509.029,55
Início da obra:	21/03/2022	CONTRATO Nº:	015/2022	V. medido:	R\$ 36.728,49
Término da obra:	21/03/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº	08	V. acumulado:	R\$ 427.601,64
Período: 23/02/2024 a 26/03/2024		SALDO:			R\$ 81.427,91

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		FINANCEIRO		EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
				PREVISTO	MEDIDO	PREVISTO	MEDIDO		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO INCLINDO CONE AF_11/2017	M	10,98	200,00		2.196,00	-	0,00%	
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA H = 70,7/76 CM	UN	60,41	20,00		1.208,20	-	0,00%	
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	54,81	6250,00	274,26	6.250,00	15.032,19	342.562,50 100,00%	
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pre-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,60	6250,00	274,26	6.250,00	2.907,16	66.250,00 100,00%	
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	79,75	625,00	104,24	49.843,75	8.313,14	8.313,14 16,68%	
1.6	Melhoria AF_05/2020 Molcho granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00	270,00	19.400,00	10.476,00	10.476,00 54,00%	
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-10, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00		22.358,10	-	0,00%	
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1,70	2520,00		4.284,00	-	0,00%	
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	m²	3,09	300,00		927,00	-	0,00%	
				TOTAL					
				SUB-TOTAL					
						509.029,55	36.728,49	427.601,64	84,00%
						509.029,55	36.728,49	427.601,64	84,00%
						509.029,55	7,22%	84,00%	

Importa a presente medição o Valor de R\$ 36.728,49 (Trinta e seis mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 5988/ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DOCUMENTOS, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

Assinado de forma digital por
SOLLAR CONSTRUTORA
LOCADORA E SERVIÇOS
LTD.A:44036692000101
Dados: 2024.03.27 07:30:20
-03'00'

Assinado de forma digital
por THIAGO AMORIM DE
MOURA:03159025403
Dados: 2024.03.26 20:33:17
-03'00'

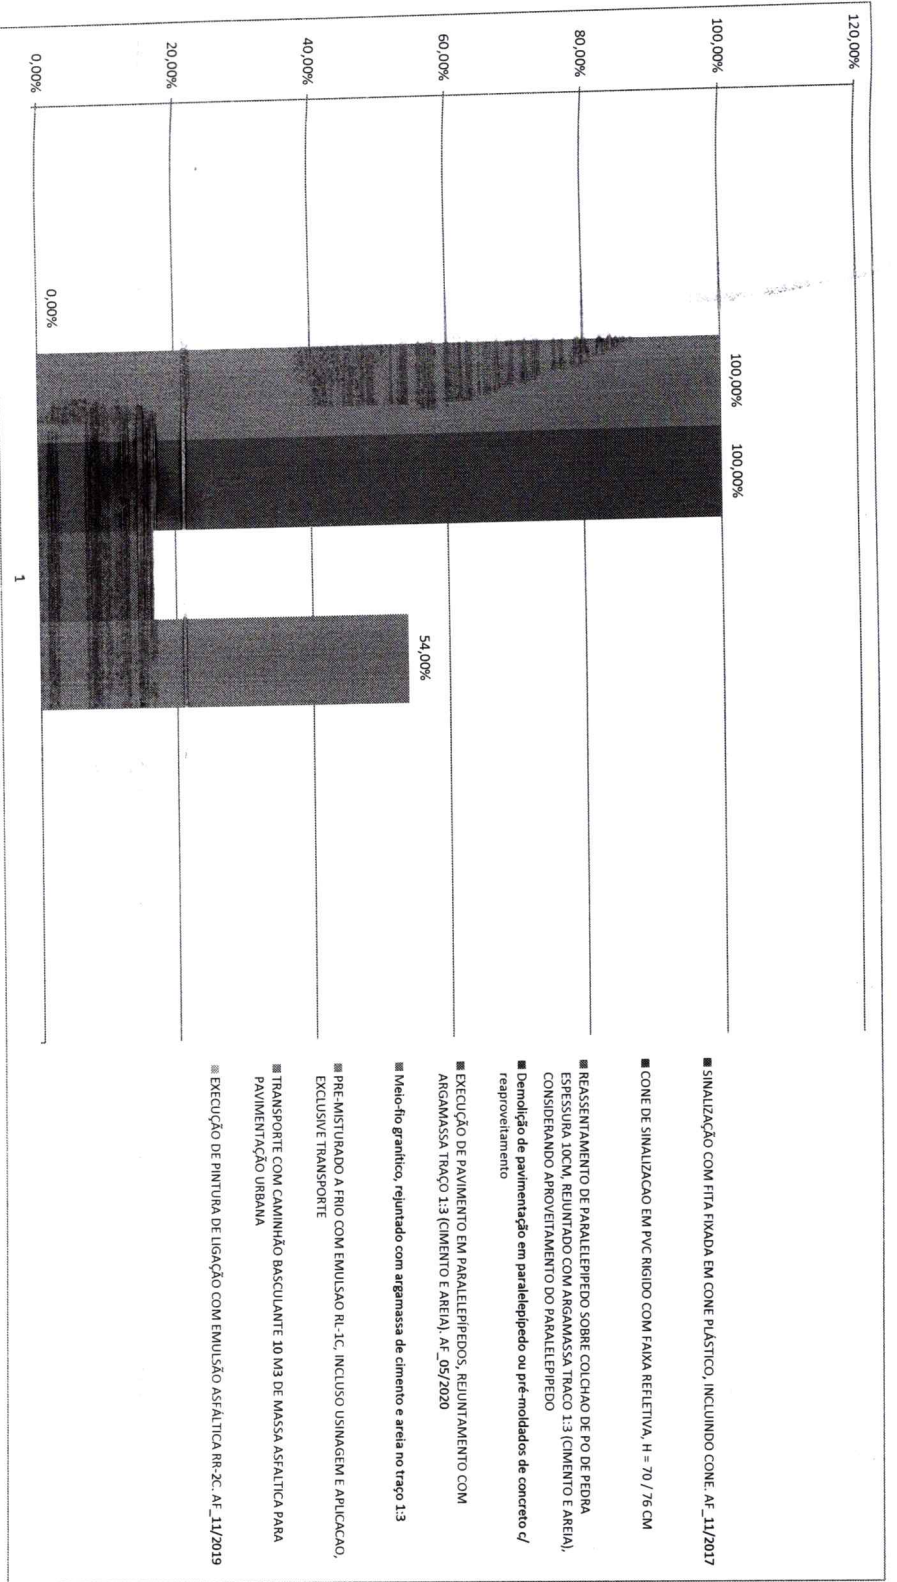

■ SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017

■ CONTEÚDO DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 75 CM

■ REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO
 ■ Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto e reaproveitamento

■ EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

■ Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

■ PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

■ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

■ EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019
