



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBJETO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO DE IGAPÓ DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE,

Contratada:

MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS EIRELI, inscrita nº CNPJ nº 32.219.949/0001-73, com sede na 2ª Travessa São Cristóvão nº 115, São Rafael, Bom Conselho-PE, CEP: 55.330-000

Processo Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº010/2023

CONTRATO Nº 05/2024

CONTRATO:

R\$ 136.264,71

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

Início da obra: 12/01/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

V. medido:

R\$ 66.031,50

Término da obra: 12/07/2024

V. acumulado:

R\$ 136.264,71

Período: 16/03/2024 a 01/05/2024

SALDO:


R\$ -

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	311,76	2,00		2,00	623,52	0,00	623,52	100,00%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	123,27	96,00	28,00	96,00	11833,92	3451,56	11833,92	100,00%
2	INFRAESTRUTURA						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	47,84	290,00		290,00	13873,60	0,00	13873,60	100,00%
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	78,18	128,40		128,40	10038,31	0,00	10038,31	100,00%
3	PISOS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	68,63	125,00	62,50	125,00	8578,75	4289,38	8578,75	100,00%
3.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	115,58	178,50	18,00	178,50	20631,03	2080,44	20631,03	100,00%
4	MOSAICO CENTRAL						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev.04	m²	99,41	22,00	22,00	22,00	2187,02	2187,02	2187,02	100,00%
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	464,87	1,30	1,30	1,30	604,33	604,33	604,33	100,00%
5	BANCOS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	89,21	2,19		2,19	195,37	0,00	195,37	100,00%
5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	464,87	0,36		0,36	167,35	0,00	167,35	100,00%
5.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	644,63	5,84		5,84	3764,64	0,00	3764,64	100,00%
5.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	8,60	16,60		16,6	142,76	0,00	142,76	100,00%
5.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,30	16,60		16,6	768,58	0,00	768,58	100,00%
5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	26,12	16,60	16,60	16,60	433,59	433,59	433,59	100,00%
5.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	3,59	16,60	16,60	16,60	59,59	59,59	59,59	100,00%
5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	18,01	16,60	16,60	16,60	298,97	298,97	298,97	100,00%
6	PAISAGISMO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	22,06	32,00		32,00	705,92	0,00	705,92	100,00%
6.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	4,52	32,00		32,00	144,64	0,00	144,64	100,00%
6.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	223,70	2,00		2,00	447,40	0,00	447,40	100,00%
6.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	464,73	4,00		4,00	1858,92	0,00	1858,92	100,00%
7	EQUIPAMENTOS METÁLICOS PARA EXERCÍCIO FÍSICO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	5.950,78	1,00	1,00	1,00	5950,78	5950,78	5950,78	100,00%
7.2	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4.730,09	1,00	1,00	1,00	4730,09	4730,09	4730,09	100,00%
7.3	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	5.111,55	1,00	1,00	1,00	5111,55	5111,55	5111,55	100,00%
7.4	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2.548,94	3,00	3,00	3,00	7646,82	7646,82	7646,82	100,00%

7.5	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	3.909,02	1,00	1,00	1,00	3909,02	3909,02	3909,02	100,00%
7.6	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2.394,73	1,00	1,00	1,00	2394,73	2394,73	2394,73	100,00%
8	EQUIPAMENTOS DE CONCRETO PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1	BARRA DE APOIO VERTICAL						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	89,21	0,24		0,24	21,41	0,00	21,41	100,00%
8.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	464,87	0,02		0,02	11,16	0,00	11,16	100,00%
8.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	2.635,31	0,94		0,94	2477,19	0,00	2477,19	100,00%
8.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	8,60	10,33		10,33	88,84	0,00	88,84	100,00%
8.1.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,30	10,33		10,33	478,28	0,00	478,28	100,00%
8.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	3,59	10,33	10,33	10,33	37,08	37,08	37,08	100,00%
8.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	m²	18,01	10,33	10,33	10,33	186,04	186,04	186,04	100,00%
8.1.8	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2"	m	86,38	3,30	3,30	3,30	285,05	285,05	285,05	100,00%
8.2	BARRA DE APOIO HORIZONTAL						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	89,21	1,80		1,80	160,58	0,00	160,58	100,00%
8.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	464,87	0,22		0,22	102,27	0,00	102,27	100,00%
8.2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	644,63	4,05		4,05	2610,75	0,00	2610,75	100,00%
8.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	8,60	6,00		6,00	51,60	0,00	51,60	100,00%
8.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,30	6,00		6,00	277,80	0,00	277,80	100,00%
8.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	3,59	6,00	6,00	6,00	21,54	21,54	21,54	100,00%
8.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	m²	18,01	6,00	6,00	6,00	108,06	108,06	108,06	100,00%
9	OUTROS ITENS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	376,88	2,00	2,00	2,00	753,76	753,76	753,76	100,00%
9.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	105,87	12,00	12,00	12,00	1270,46	1270,46	1270,46	100,00%
9.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	59,88	130,00	130,00	130,00	7784,63	7784,63	7784,63	100,00%
9.4	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	638,33	4,00	4,00	4,00	2553,34	2553,34	2553,34	100,00%
9.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	585,22	8,00	8,00	8,00	4681,77	4681,77	4681,77	100,00%
9.6	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	188,05	4,00	4,00	4,00	752,20	752,20	752,20	100,00%
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,19	110,00	110,00	110,00	791,00	791,00	791,00	100,00%
9.8	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 12,5 A 15 MM	UN	15,42	4,00	4,00	4,00	61,68	61,68	61,68	100,00%
9.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	188,95	4,00	4,00	4,00	755,82	755,82	755,82	100,00%
9.10	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	17,72	30,00	30,00	30,00	531,72	531,72	531,72	100,00%
9.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	77,56	17,40	17,40	17,40	1349,61	1349,61	1349,61	100,00%
9.12	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	36,99	26,00	26,00	26,00	961,81	961,81	961,81	100,00%
TOTAL							136.264,71	66.031,50	136.264,71	100,00%

Importa a presente medição o Valor de R\$ 66.031,50 (Sessenta e seis mil trinta e um reais e cinquenta centavos).

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO DE IGAPÓ DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE,

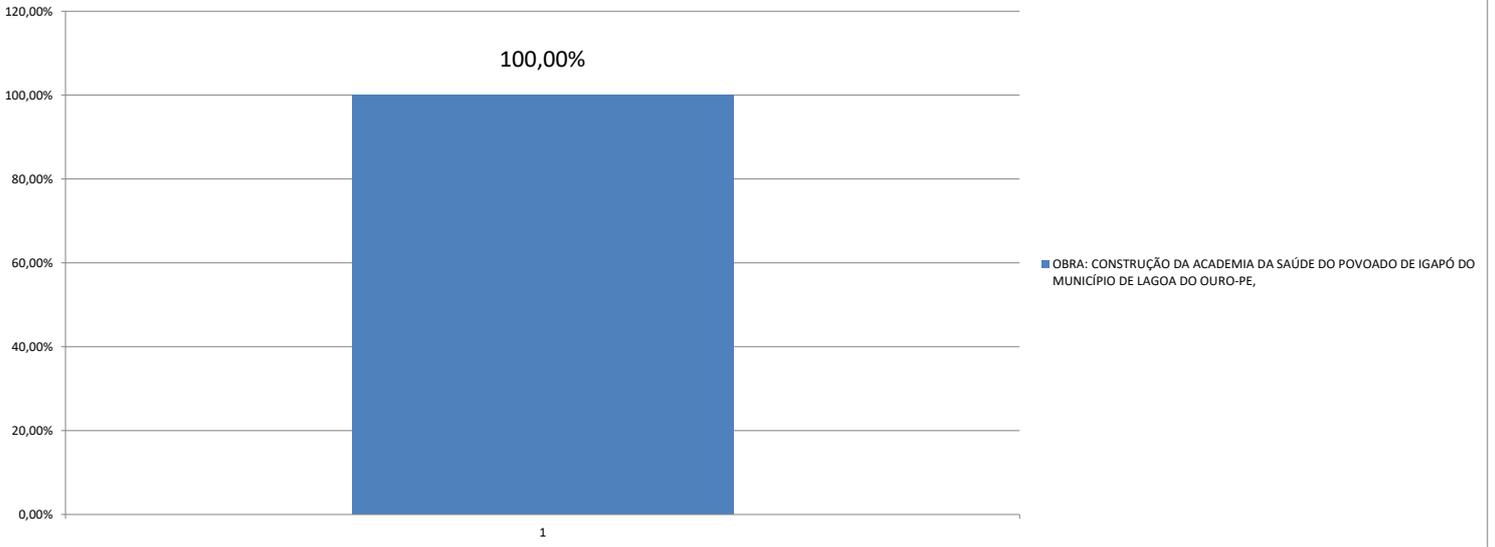

**THIAGO
AMORIM DE
MOURA:031
59025403**

Assinado de forma
digital por THIAGO
AMORIM DE
MOURA:03159025403
Dados: 2024.05.01
17:36:54 -03'00'
