



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada:

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:  
44.036.693/0001-01.

Processo Nº

PROCESSO Nº 011/2022, TP Nº 01/2022

CONTRATO Nº:  
015/2022

CONTRATO:

R\$ 509.029,55

### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09

Início da obra: 21/03/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº

V. medido:

R\$ 9.418,08

Término da obra: 21/03/2023

09

V. acumulado:

R\$ 9.418,08

Período: 21/03/2024 a 07/04/2024


SALDO:

R\$ 499.611,47

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1.0	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF 11/2017	M	10,98	200,00			2.196,00	-	-	0,00%
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA. H = 70 / 76 CM	UN	60,41	20,00			1.208,20	-	-	0,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	54,81	6250,00			342.562,50	-	-	0,00%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,60	6250,00	104,24	104,24	66.250,00	1.104,94	1.104,94	1,67%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	79,75	625,00	104,24	104,24	49.843,75	8.313,14	8.313,14	16,68%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00			19.400,00	-	-	0,00%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00			22.358,10	-	-	0,00%
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1,70	2520,00			4.284,00	-	-	0,00%
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3,09	300,00			927,00	-	-	0,00%
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>509.029,55</b>	<b>9.418,08</b>	<b>9.418,08</b>	<b>1,85%</b>
			<b>TOTAL</b>				<b>509.029,55</b>	<b>9.418,08</b>	<b>9.418,08</b>	<b>1,85%</b>
							<b>509.029,55</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,85%</b>	

Importa a presente medição o Valor de R\$ 9.418,08 (Nove mil quatrocentos e dezoito reais e oito centavos)

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184 ,DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

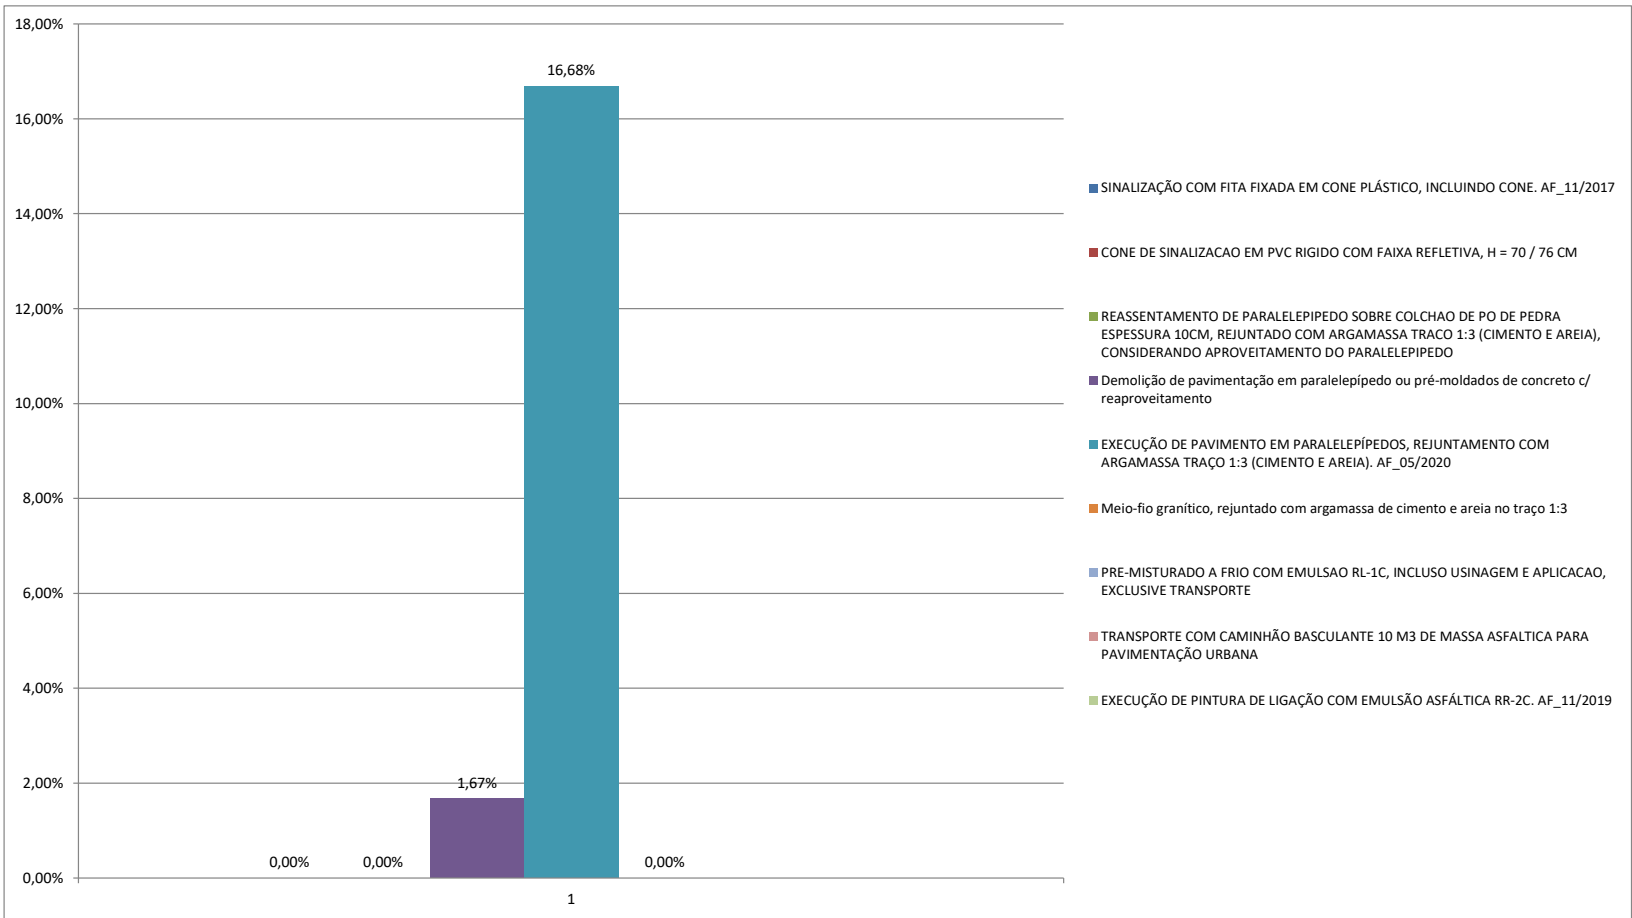

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

PARALELEPIPEDO  
 12X2,5=30  
 5X3,5=17,5  
 3,5X4,30=15,05  
 3X3=9  
 5X2,5=12,5  
 8X3=24  
 9X3,5=31,50  
 30X2,5=75  
 5X3,5=17,5  
 8,5X3,40=28,9  
 1X1=1  
 3,5X1,5=5,25  
 TOTAL 267,2

TAPA BURACO  
 1X1,5=1,5  
 3X1,5=4,5  
 3X4=12  
 3X3,5=10,50  
 15X1=15  
 21X1=21  
 20X1=20  
 4X1=4  
 6X2=12  
 3X2=6  
 15X3=45  
 10X2=20  
 TOTAL 171,5

8X4=32  
 10X3=30  
 12X2=24  
 5X3=15  
 3X2,5=7,5  
 4X2,5=10  
 12X4=48  
 20X5=100  
 13X3=39  
 25X1=25  
 15X0,5=7,5  
 9X1,5=9,45  
 8X3,5=28  
 6X3=18  
 TOTAL 393,45

35X2,5=87,5  
 7X2=14  
 8X3,5=28  
 6X4=24  
 11X2=22  
 18X1=18  
 5X2,5=12,5  
 7X3=21  
 8X3,5=28  
 21X2,5=52,5  
 7X3=21  
 10X2=20  
 8X2=16  
 15X1,5=22,5  
 TOTAL 387

3X1=3  
 4X1=4  
 8X1,5=12  
 12X1=12  
 15X2=30  
 8X3,5=28  
 7X3=21  
 12X5=60  
 19X3,5=66,5  
 14X2,5=35  
 8X4=32  
 5X2=10  
 6X0,50=3  
 10X0,50=5  
 21X0,50=10,5  
 7X2,5=17,5  
 3X1=3  
 5X2,5=12,5  
 6X2=12  
 3X1,5=4,5

270 METROS DE MEIO FIO LAGOA DO OURO

**POVOADO CAMPO ALEGRE**

PRAÇA ANTONIO CLAUDINO TEXEIRA  
 RUA DA PALHA  
 RUA DA CRECHE  
 RUA DO GRUPO  
 RUA DO GRUPO

total	378,5
Medido ultimo boletim	274,26
Resta medir	<b>104,24</b>
