



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada:

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:  
44.036.693/0001-01.

Processo Nº

PROCESSO Nº 011/2022, TP Nº 01/2022

CONTRATO Nº:  
015/2022

CONTRATO:

R\$ 509.029,55

Início da obra:

21/03/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº

V. medido:

R\$ 79.461,57

Término da obra:

21/03/2023

10

V. acumulado:

R\$ 88.879,65

Período: 08/04/2024 a 28/04/2024

SALDO:


R\$ 420.149,90

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO	
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
1.0	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF 11/2017	M	10,98	200,00			2.196,00	-	-	0,00%	
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA. H = 70 / 76 CM	UN	60,41	20,00			1.208,20	-	-	0,00%	
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	54,81	6250,00	1336,50	1.336,50	342.562,50	73.253,57	73.253,57	21,38%	
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,60	6250,00		104,24	66.250,00	-	1.104,94	1,67%	
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	79,75	625,00		104,24	49.843,75	-	8.313,14	16,68%	
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00	160,00	160,00	19.400,00	6.208,00	6.208,00	32,00%	
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00			22.358,10	-	-	0,00%	
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1,70	2520,00			4.284,00	-	-	0,00%	
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	3,09	300,00			927,00	-	-	0,00%	
							<b>SUB-TOTAL</b>	<b>509.029,55</b>	<b>79.461,57</b>	<b>88.879,65</b>	<b>17,46%</b>
			<b>TOTAL</b>				<b>509.029,55</b>	<b>79.461,57</b>	<b>88.879,65</b>	<b>17,46%</b>	
							<b>509.029,55</b>	<b>15,61%</b>	<b>17,46%</b>		

Importa a presente medição o Valor de R\$ 79.461,57 (Setenta e nove mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184 ,DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

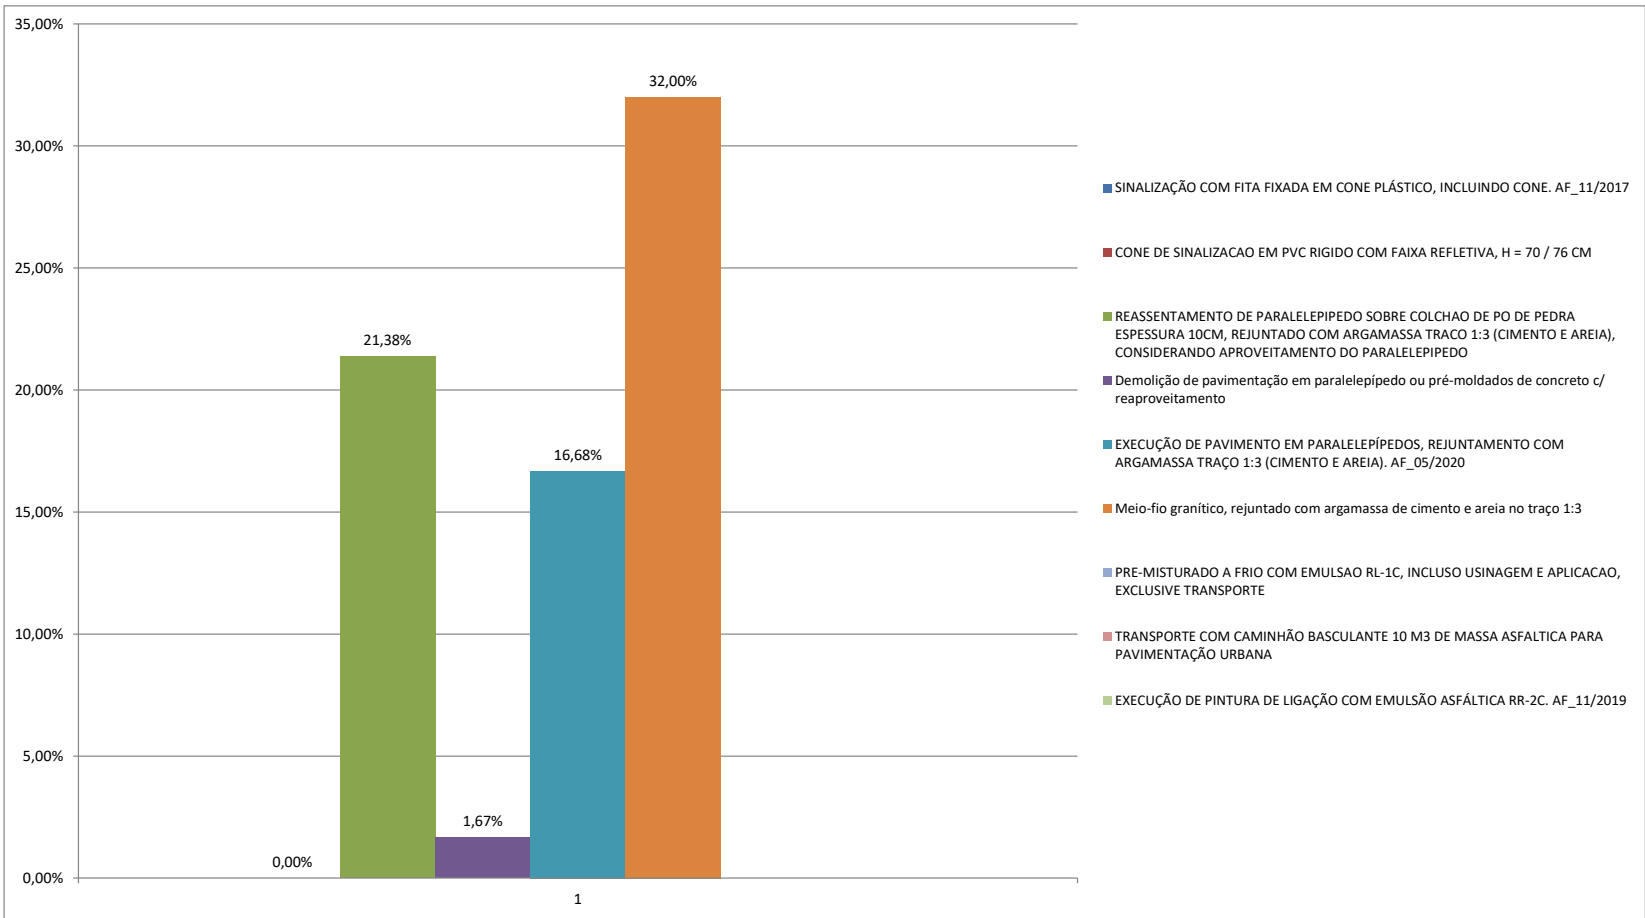

**locais de trabalho****Zona urbana, Centro da cidade**

RUA D

RUA C

Praça Antônio Claudino Teixeira

Rua Pesqueira

Rua Campo Alegre

Rua da creche- sem nome

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

<b>comprimento</b>	<b>largura</b>	<b>total</b>
40,00	3,00	120,00
30,00	2,00	60,00
9,00	3,00	27,00
8,00	1,00	8,00
7,00	3,00	21,00
6,00	2,00	12,00
10,00	3,00	30,00
12,00	2,00	24,00
13,00	1,00	13,00
11,00	2,00	22,00
14,00	2,00	28,00
5,00	3,00	15,00
25,00	1,00	25,00
10,00	3,00	30,00
12,00	1,00	12,00
11,00	1,00	11,00
8,00	3,00	24,00
9,00	2,50	22,50
8,00	2,00	16,00
15,00	1,00	15,00
26,00	1,00	26,00
3,00	2,00	6,00
6,00	4,00	24,00
2,00	1,00	2,00
12,00	1,00	12,00
16,00	1,00	16,00
5,00	2,00	10,00
30,00	1,00	30,00
6,00	5,00	30,00
18,00	3,00	54,00
8,00	2,00	16,00
9,00	3,00	27,00
12,00	2,50	30,00
21,00	1,00	21,00
28,00	2,50	70,00
11,00	3,50	38,50
15,00	1,00	15,00
3,50	2,00	7,00
10,00	2,50	25,00
15,00	2,00	30,00
19,00	2,50	47,50
8,00	3,00	24,00
13,00	2,50	32,50
7,00	3,00	21,00
9,00	2,50	22,50
17,00	3,00	51,00
14,00	2,50	35,00
8,00	1,00	8,00
11,00	2,50	27,50
17,00	1,50	25,50
3,00	1,50	4,50
5,00	2,50	12,50
		<b>1336,50</b>
