



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBJETO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada:

VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 28.796.562/0001-02

Processo Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023

CONTRATO Nº 256/2023

CONTRATO:

R\$ 56.071,61

Início da obra:

21/12/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

V. medido:

R\$ 21.468,86

Término da obra:

21/12/2024

V. acumulado:

R\$ 21.468,86

Período: 21/12/2023 a 28/02/2024

SALDO:

R\$ 34.602,75

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	
PÓRТИCO DE ACESSO DO POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE										
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 464,67	2	2,00	2,00	929,34	929,34	929,34	100,00%
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	R\$ 950,78	1			950,78	0,00	0,00	0,00%
2	INFRAESTRUTURA						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	R\$ 72,36	6	6,00	6,00	434,16	434,16	434,16	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R\$ 95,55	0,9	0,90	0,90	86,00	86,00	86,00	100,00%
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	R\$ 563,83	0,045	0,05	0,05	25,37	25,37	25,37	100,00%
3	SUPERESTRUTURA - PILARES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	R\$ 3.255,25	5,85	5,85	5,85	19043,21	19043,21	19043,21	100,00%
4	SUPERESTRUTURA - VIGAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	R\$ 463,16	2			926,32	0,00	0,00	0,00%
5	REVESTIMENTO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	R\$ 637,32	43,2			27532,22	0,00	0,00	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 333,76	2			667,52	0,00	0,00	0,00%
6.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$ 345,47	2			690,94	0,00	0,00	0,00%
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	R\$ 23,62	20			472,40	0,00	0,00	0,00%
6.4	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", p/penitenciária - Rev. 01	un	R\$ 134,26	2			268,52	0,00	0,00	0,00%
7	OUTROS ITENS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	R\$ 188,57	21,45			4044,83	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL							56.071,61	20.518,08	20.518,08	36,59%
PÓRТИCO DE ACESSO DO POVOADO IGAPÓ EM LAGOA DO OURO-PE										
1	SERVIÇOS INICIAIS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 464,67	2	2	2	929,34	929,34	929,34	100,00%
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	R\$ 950,78	1	1	1	950,78	950,78	950,78	100,00%
2	INFRAESTRUTURA						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	R\$ 72,36	6	6	6	434,16	434,16	434,16	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R\$ 95,55	0,9	0,9	0,9	86,00	86,00	86,00	100,00%
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	R\$ 563,83	0,045	0,045	0,045	25,37	25,37	25,37	100,00%
3	SUPERESTRUTURA - PILARES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	R\$ 3.255,25	5,85	5,85	5,85	19043,21	19043,21	19043,21	100,00%
4	SUPERESTRUTURA - VIGAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	R\$ 463,16	2			926,32	0,00	0,00	0,00%
5	REVESTIMENTO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	R\$ 637,32	43,2			27532,22	0,00	0,00	0,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 333,76	2			667,52	0,00	0,00	0,00%
6.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$ 345,47	2			690,94	0,00	0,00	0,00%
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	R\$ 23,62	20			472,40	0,00	0,00	0,00%
6.4	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", p/penitenciária - Rev. 01	un	R\$ 134,26	2			268,52	0,00	0,00	0,00%

7	OUTROS ITENS				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	R\$ 188,57	21,45	4044,83	0,00	0,00	0,00%

SUB-TOTAL

					56.071,61	21.468,86	21.468,86	38,29%
--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------


TOTAL

					112.143,18	41.986,94	41.986,94	
--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	--

Importa a presente medição o Valor de R\$ 41.986,94 (Quarenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184, DO CODIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

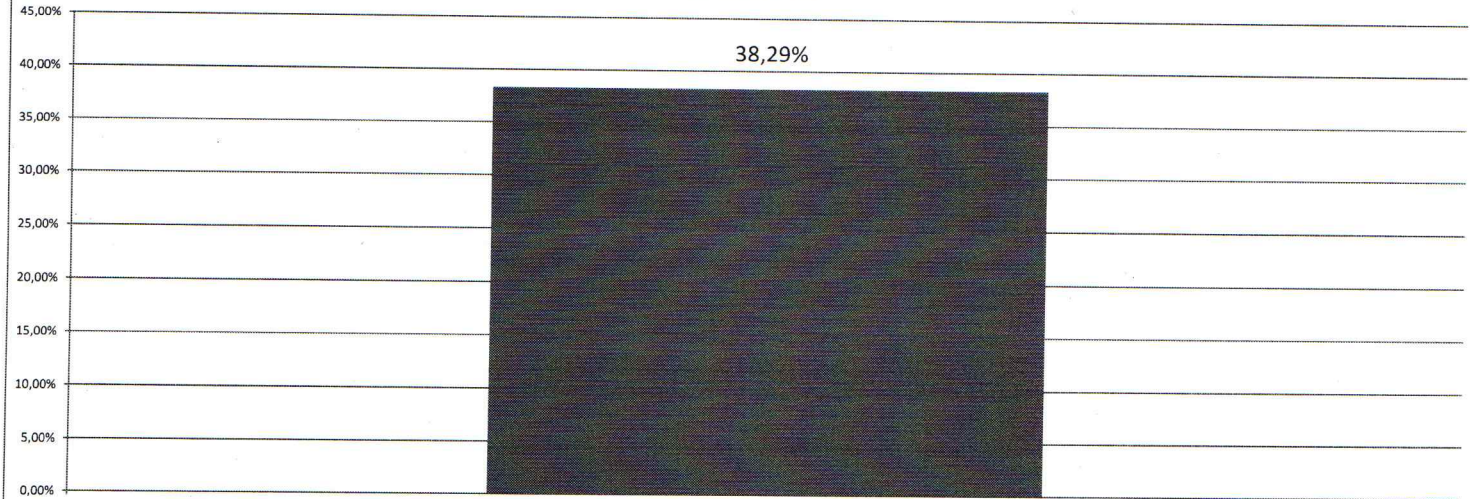

1

THIAGO AMORIM DE MOURA:0315902540
 3

Assinado de forma digital por
 THIAGO AMORIM DE
 MOURA:03159025403
 Dados: 2024.02.28 19:58:58 -03'00'

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=RFB e-CPF A1
 Reason: I am the author of this document


7	OUTROS ITENS				0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	R\$ 188,57	21,45	4044,83	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL					56.071,61	21.468,86	21.468,86	38,29%

TOTAL				112.143,18	41.986,94	41.986,94
-------	--	--	--	------------	-----------	-----------

Importa a presente medição o Valor de R\$ 41.986,94 (Quarenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184, DO CODIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

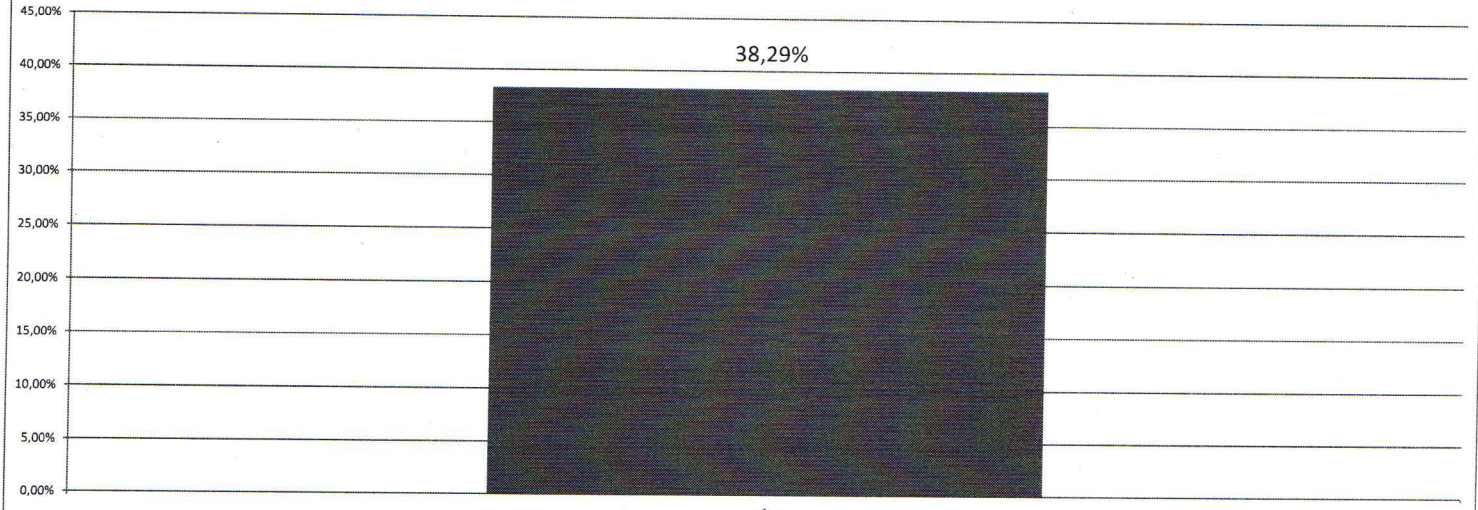

1

THIAGO AMORIM DE MOURA:0315902540
 3
 Assinado de forma digital por
 THIAGO AMORIM DE MOURA:03159025403
 Dados: 2024.02.28 19:58:58 -03'00'

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=RFB e-CPF A1
 Reason: I am the author of this document
