



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.246.267/0001-03

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBJETO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada:

VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 28.796.562/0001-02

Processo Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº

CONTRATO Nº 256/2023

CONTRATO:

R\$ 112.143,18

Início da obra:

21/12/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº

V. medido:

R\$ 32.503,37

Término da obra:

21/12/2024

02

V. acumulado:

R\$ 74.490,31

Período: 29/02/2024 a 01/04/2024

SALDO:

R\$ 37.652,87

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	
PÓRTECO DE ACESSO DO POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE										
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 464,67	2		2,00	929,34	0,00	929,34	100,00%
1.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	R\$ 950,78	1			950,78	0,00	0,00	0,00%
2	INFRAESTRUTURA						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018	M	R\$ 72,36	6		6,00	434,16	0,00	434,16	100,00%
2.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R\$ 95,55	0,9		0,90	86,00	0,00	86,00	100,00%
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	R\$ 563,83	0,045		0,05	25,37	0,00	25,37	100,00%
3	SUPERESTRUTURA- PILARES						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	R\$ 3.255,25	5,85		5,85	19043,21	0,00	19043,21	100,00%
4	SUPERESTRUTURA- VIGAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	R\$ 463,16	2	2	2	926,32	926,32	926,32	100,00%
5	REVESTIMENTO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	R\$ 637,32	43,2	43,2	43,2	27532,22	27532,22	27532,22	100,00%
6	INSTALACOES ELETRICAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 333,76	2			667,52	0,00	0,00	0,00%
6.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$ 345,47	2			690,94	0,00	0,00	0,00%
6.3	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022	M	R\$ 23,62	20			472,40	0,00	0,00	0,00%
6.4	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", p/penitência - Rev. 01	un	R\$ 134,26	2			268,52	0,00	0,00	0,00%
7	OUTROS ITENS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	R\$ 188,57	21,45	21,45	21,45	4044,83	4044,83	4044,83	100,00%
SUB-TOTAL							56.071,61	32.503,37	59.021,45	94,56%
PÓRTECO DE ACESSO DO POVOADO IGAPÓ EM LAGOA DO OURO-PE										
1	SERVIÇOS INICIAIS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	R\$ 464,67	2		2	929,34	0,00	929,34	100,00%
1.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	R\$ 950,78	1		1	950,78	0,00	950,78	100,00%
2	INFRAESTRUTURA						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018	M	R\$ 72,36	6		6	434,16	0,00	434,16	100,00%
2.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R\$ 95,55	0,9		0,9	86,00	0,00	86,00	100,00%
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	R\$ 563,83	0,045		0,045	25,37	0,00	25,37	100,00%
3	SUPERESTRUTURA- PILARES						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	R\$ 3.255,25	5,85		5,85	19043,21	0,00	19043,21	100,00%
4	SUPERESTRUTURA- VIGAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	R\$ 463,16	2			926,32	0,00	0,00	0,00%
5	REVESTIMENTO						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	R\$ 637,32	43,2			27532,22	0,00	0,00	0,00%
6	INSTALACOES ELETRICAS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 333,76	2			667,52	0,00	0,00	0,00%
6.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$ 345,47	2			690,94	0,00	0,00	0,00%
6.3	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022	M	R\$ 23,62	20			472,40	0,00	0,00	0,00%
6.4	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", p/penitência - Rev. 01	un	R\$ 134,26	2			268,52	0,00	0,00	0,00%

7	OUTROS ITENS						0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.1	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	R\$ 188,57	21,45			4044,83	0,00	0,00	0,00%
SUB-TOTAL							56.071,61	-	21.468,86	38,29%
TOTAL							112.143,18	32.503,37	74.490,31	

Importa a presente medição o Valor de R\$ 32.503,37 (Trinta e dois mil quinhentos e três reais e trinta e sete centavos).

E PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184, DO CODIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

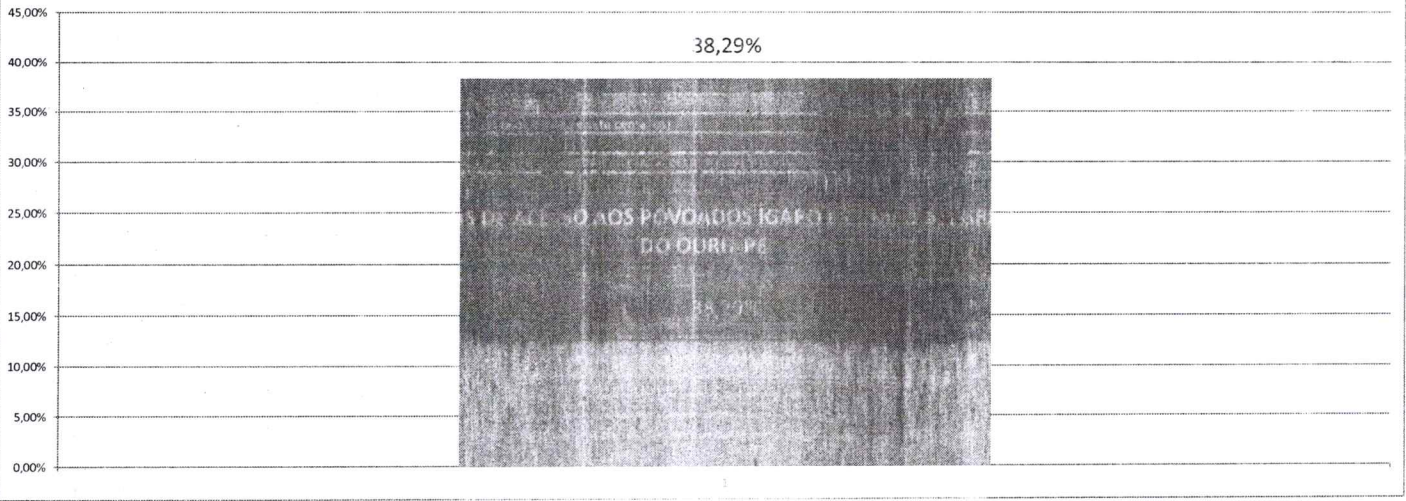

THIAGO AMORIM DE MOURA:0315902540
 Assinado de forma digital por THIAGO AMORIM DE MOURA:0315902540
 Data: 2024.04.02 10:30:19 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 ATYLA SOSTENES GUIMARAES
 Data: 02/04/2024 10:30:44 -0300
 Verifique em: <https://validar.fti.gov.br>
