



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO  
CNPJ: 11.296.267/0001-63

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03**

OBJETO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada:

VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 28.796.562/0001-02

Processo Nº

TOMADA DE PREÇOS Nº

CONTRATO Nº 256/2023

CONTRATO:

R\$ 112.143,18

Início da obra: 21/12/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº

V. medido:

R\$ 35.751,35

Término da obra: 21/12/2024

03

V. acumulado:

R\$ 111.192,44

Período: 02/04/2024 a 29/05/2024

SALDO:

R\$ 950,74


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO		
<b>PÓRTICO DE ACESSO DO POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE</b>											
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 464,67	2		2,00		929,34	0,00	929,34	100,00%
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	R\$ 950,78	1				950,78	0,00	0,00	0,00%
2	<b>INFRAESTRUTURA</b>										
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	R\$ 72,36	6		6,00		434,16	0,00	434,16	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R\$ 95,55	0,9		0,90		86,00	0,00	86,00	100,00%
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m²	R\$ 563,83	0,045		0,05		25,37	0,00	25,37	100,00%
3	<b>SUPERESTRUTURA- PILARES</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	R\$ 3.255,25	5,85		5,85		19043,21	0,00	19043,21	100,00%
4	<b>SUPERESTRUTURA- VIGAS</b> Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	R\$ 463,16	2		2		926,32	0,00	926,32	100,00%
5	<b>REVESTIMENTO</b> Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	R\$ 637,32	43,2		43,2		27532,22	0,00	27532,22	100,00%
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
6.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 333,76	2	2	2		667,52	667,52	667,52	100,00%
6.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$ 345,47	2	2	2		690,94	690,94	690,94	100,00%
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	R\$ 23,62	20	20	20		472,40	472,40	472,40	100,00%
6.4	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", nomenclatura - Rev. 01	un	R\$ 134,26	2	2,00	2,00		268,52	268,52	268,52	100,00%
7	<b>OUTROS ITENS</b>										
7.1	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (colocação)	m²	R\$ 188,57	21,45		21,45		4044,83	0,00	4044,83	100,00%
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>56.071,61</b>	<b>2.099,38</b>	<b>55.120,83</b>	<b>98,30%</b>	
<b>PÓRTICO DE ACESSO DO POVOADO IGAPÓ EM LAGOA DO OURO-PE</b>											
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 464,67	2		2		929,34	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	R\$ 950,78	1	-1	1		950,78	-950,78	950,78	100,00%
2	<b>INFRAESTRUTURA</b>										
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	R\$ 72,36	6		6		434,16	0,00	434,16	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	R\$ 95,55	0,9		0,9		86,00	0,00	86,00	100,00%
2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m²	R\$ 563,83	0,045		0,045		25,37	0,00	25,37	100,00%
3	<b>SUPERESTRUTURA- PILARES</b> (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	R\$ 3.255,25	5,85		5,85		19043,21	0,00	19043,21	100,00%
4	<b>SUPERESTRUTURA- VIGAS</b> Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	R\$ 463,16	2	2,00	2,00		926,32	926,32	926,32	100,00%
5	<b>REVESTIMENTO</b> Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	R\$ 637,32	43,2	43,20	43,20		27532,22	27532,22	27532,22	100,00%
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
6.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	R\$ 333,76	2	2,00	2,00		667,52	667,52	667,52	100,00%
6.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	R\$ 345,47	2	2,00	2,00		690,94	690,94	690,94	100,00%
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	R\$ 23,62	20	20,00	20,00		472,40	472,40	472,40	100,00%
6.4	Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", nomenclatura - Rev. 01	un	R\$ 134,26	2	2,00	2,00		268,52	268,52	268,52	100,00%

OUTROS ITENS						0,00	0,00	0,00	#DN/01	
7.1	Platagem de adesivo vinil em letreiro (c/ aplicação)	m²	R\$ 188,57	21,45	21,45	21,45	4044,83	4044,83	4044,83	100,00%
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>56.071,61</b>	<b>33.651,97</b>	<b>56.071,61</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL</b>							<b>112.143,18</b>	<b>35.751,35</b>	<b>111.192,44</b>	

Importa a presente medição o Valor de R\$ 35.751,35 (Trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184, DO CODIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

### OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AOS POVOADOS IGAPÓ E CAMPO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

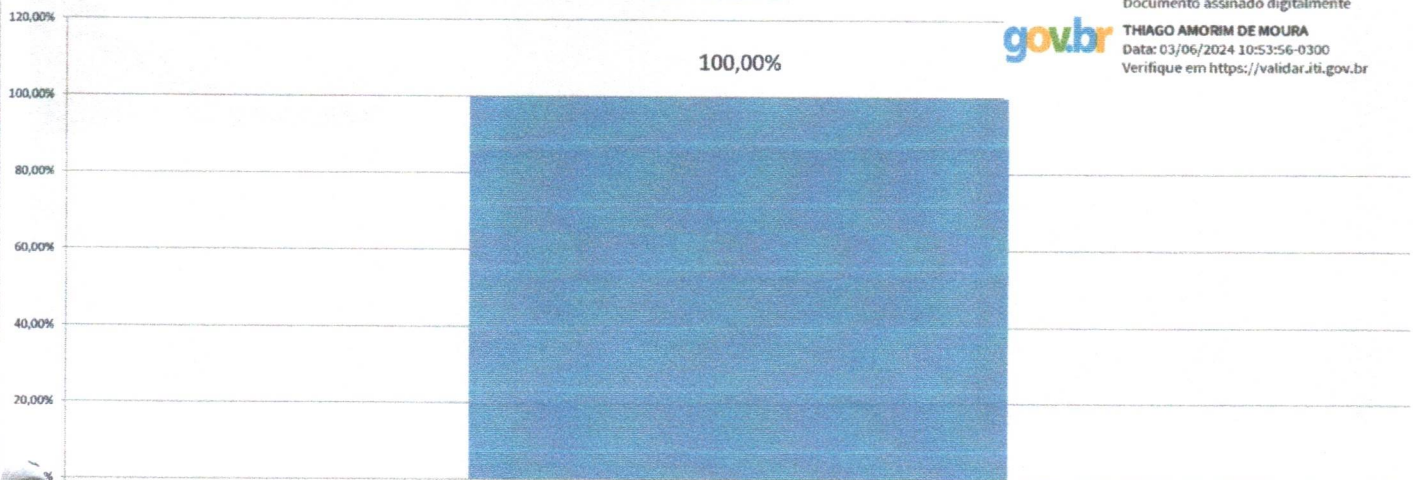

Documento assinado digitalmente  
**THIAGO AMORIM DE MOURA**  
 Data: 03/06/2024 10:53:56-0300  
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>
