


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		ACUMULADO	FINANCEIRO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
				PREVISTO	MEDIDO		PREVISTO	MEDIDO	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE AF. 11/2017	M	10,98	200,00		2.196,00	-		0,00%
1.2	CONCRETO DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA H= 70/76 CM	UN	60,41	20,00		1.208,20	-		0,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	54,81	6250,00	473,60	342.562,50	25.958,02	327.530,51	95,61%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,80	6250,00	473,60	66.250,00	5.020,16	63.337,84	95,61%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 06/2020	m²	79,75	625,00		49.843,75	-		0,00%
1.6	Melo-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00		19.400,00	-		0,00%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00		22.358,10	-		0,00%
1.8	BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MX	1,70	2520,00		4.284,00	-		0,00%
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF. 11/2019	m²	3,09	300,00		927,00	-		0,00%
<b>TOTAL</b>						<b>509.029,55</b>	<b>30.978,18</b>	<b>390.873,15</b>	<b>76,79%</b>
						<b>509.029,55</b>	<b>30.978,18</b>	<b>390.873,15</b>	<b>76,79%</b>
						<b>509.029,55</b>	<b>6,09%</b>	<b>76,79%</b>	

Importa a presente medição o Valor de R\$ 30.978,18 (Trinta mil novecentos e setenta e oito reais e deztoito centavos)

E PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº 5988-ARTIGO 184, DO CÓDIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DOCUMENTOS, SEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.

**SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA:44036692000101**  
 Assinado de forma digital por THIAGO AMORIM DE MOURA:03159025403  
 Dados: 2024.01.23 07:21:00

**THIAGO AMORIM DE MOURA:03159025403**  
 Assinado de forma digital por THIAGO AMORIM DE MOURA:03159025403  
 Dados: 2024.01.22 21:31:56 -03'00'

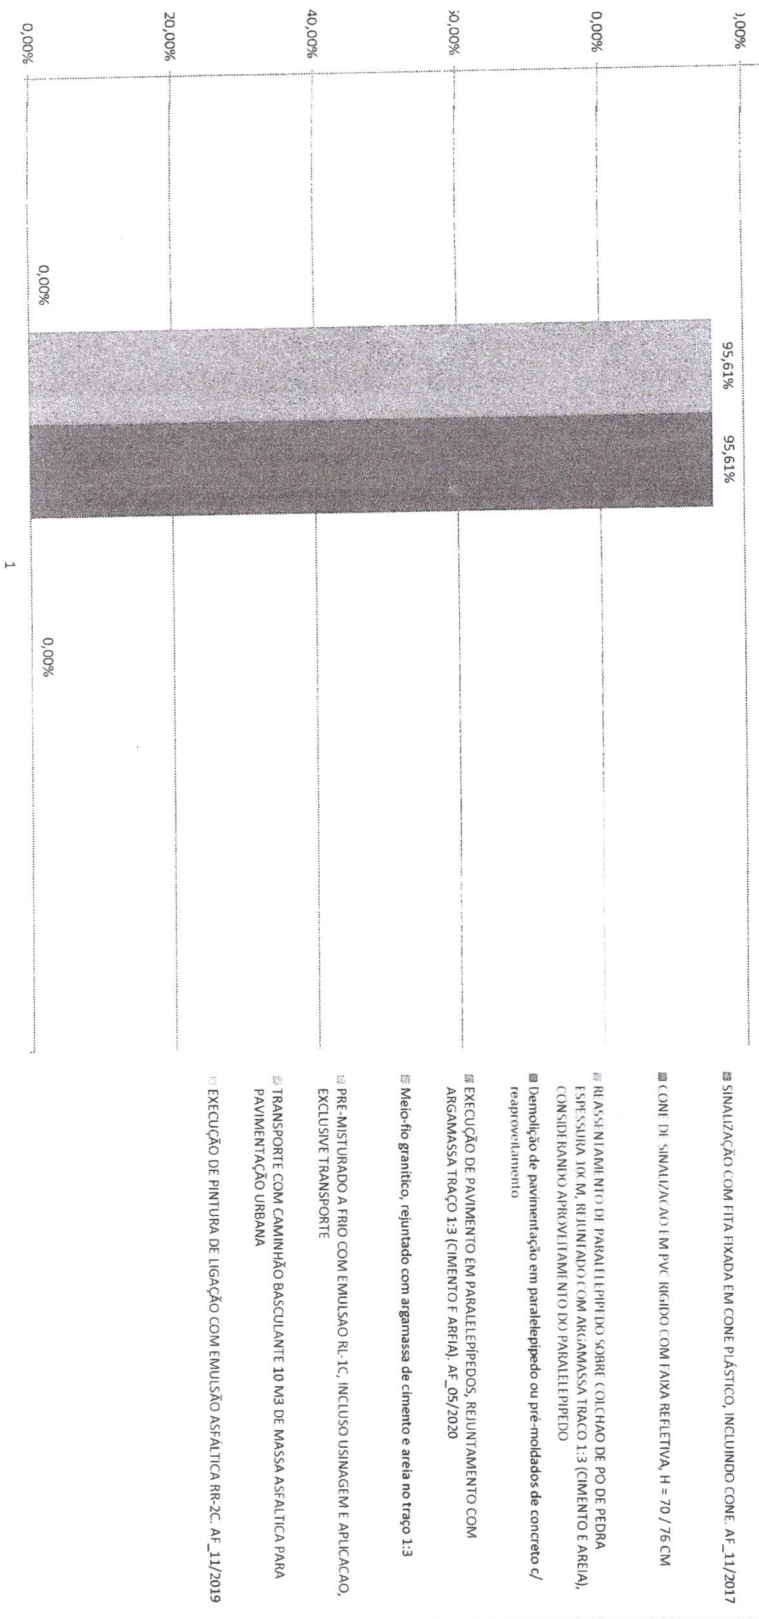

■ SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF\_11/2017

■ CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 75 CM

■ REASSINTEAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COCHO DE PO DE PEDRA ESFÉRICA 10 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSISTENDO EM APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO

■ Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento

■ EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF\_05/2020

■ Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

■ PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSIVE USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

■ TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

■ EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF\_11/2019

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

NOMES DAS RUAS	METRAGEM
Rua Capão Amador Monteiro	16 X 0,90
Rua Joaquim Alves	12 X 1,20
Rua Julite Maurício de Melo	17 X 1,00
Rua Joaomonteiro	25 X 0,80
Rua Faúza Lopes	18 X 0,80
Rua Hildebrando Luiz de Carvalho	31 X 0,90
Avenida Sáo Cristóvão	107 X 0,90
Rua Julite Vieira de Melo	35 X 2,00
Rua Osvaldo José Monteiro	22 X 0,90
Rua Artides Nery Monteiro	28 X 0,60
Rua Francisco da Silva	21 X 1,00
Rua da Aurora	28 X 3,00
Rua Leonildo Candido de Melo	16 X 3,60

Total	473,60 m <sup>2</sup>
-------	-----------------------
